



# Municipalidad de Buenos Aires

## Informe Anual de Rendición de Cuentas

Gestión Vial  
2021

JUNTA VIAL CANTONAL

1-1-2022



## Contenido

Presentación .....	2
Junta Vial Cantonal .....	3
Aspectos Estratégicos .....	4
Visión .....	4
Misión.....	4
Departamento de Gestión Vial Municipal .....	5
1. Presupuestos y Planes de Trabajo.....	6
2. Recursos Transferidos .....	9
3. Proyectos Programados.....	9
4. Ejecución de recursos, según Metas propuestas en Plan Anual Operativo. ....	10
5. Resumen de la evaluación del Plan Anual Operativo en el 2021. ....	12
6. Procesos de Contratación. ....	15
7. Ejecución de la Obra .....	16
8. Inventario de maquinaria y vehículos en uso. ....	17
9. Promoción Social .....	18
10. Desglose de intervención en Obra Vial según programación 2021 .....	29
11. Anexos .....	34





## Presentación

Según el Reglamento Sobre el Manejo, Normalización y Responsabilidad para la Inversión Pública en la Red Vial Cantonal, proveniente de la Ley N° 8114 de Simplificación y Eficiencia Tributaria (Ley N° 8114), es competencia de esta Junta Vial Cantonal rendir cuentas ante el Concejo Municipal y la comunidad en general.

En cumplimiento a lo anterior, esta Secretaría Técnica de la Junta Vial Cantonal de Buenos Aires procede a presentar con gusto el presente documento nombrado Informe Anual Rendición de Cuentas 2021, correspondiente a las gestiones de trabajo realizadas por el departamento de Gestión Vial Municipal durante el año 2021 con **fondos provenientes del artículo 5 inciso b) de la Ley N° 8114 y Ley 9329.**

El objetivo de este informe es cumplir con la normativa vigente en materia de rendición de cuentas especialmente en cumplimiento con la directriz D-1-2002-CO-DFOE de la Contraloría General de la República. Siendo claros y transparentes ante la ciudadanía por lo que, pretende ser un reflejo real de los alcances logrados en el periodo 2021.

La preparación de este informe estuvo a cargo de la Licda. Eliana Obregón Montiel M.B.A Coordinadora Administrativa con colaboración del personal Administrativo, Bach. Kevin Vargas Rodríguez, el Lic. Malbon Barrantes Obando y el MBA Rudy Pérez Astorga; la información contenida corresponde a datos surgidos en el departamento gracias a la gestión realizada por cada funcionario Técnico, Social y Administrativo del departamento de Gestión Vial en el periodo 2021.

En sentido de alcanzar el objetivo del presente informe, se procede a hacer efectiva la Rendición de Cuentas 2021 de la Junta Vial Cantonal ante el Concejo Municipal y a la comunidad en general del Cantón de Buenos Aires.





## Junta Vial Cantonal

Es un órgano público no estatal, nombrado por el concejo Municipal ante quien responde por su gestión. Tiene una función de consulta en la planificación y evaluación en materia de obra pública vial y servicio vial municipal.

Dentro de sus funciones principales está la asignación de recursos económicos establecidos en la Ley 8114, con asesoramiento técnico del Departamento de Gestión Vial, quien se encarga de las especificaciones técnicas para poder desarrollar las obras físicas definidas.

La Junta Vial 2021 estuvo conformada por el alcalde, un miembro del Concejo, un representante de los Consejos de distritos, un representante de Asociaciones de Desarrollo Integral y el director del Departamento de Gestión Vial.

Miembros actuales de la Junta Vial:

Alcalde	Mba. José Bernardino Rojas Méndez
Consejo Municipal	Sr. Melvin Cordero Campos
Consejos de Distritos	Sr. Rafael Altamirano Santos
Asociaciones de Desarrollo	Sr. Marco Tulio Fallas Prado
Ing de Gestión Vial	Ing. David Salazar Aguilar





## Aspectos Estratégicos

### Visión

Contar con una Red Vial Cantonal actualizada que facilite procesos de organización que permitan el desarrollo de obras físicas en pro del mejoramiento de las rutas y puentes ubicadas en asfalto, TSB3, lastre y tierra con participación activa de los Consejos de Distritos, Instituciones Públicas, Empresa Privada, Asociaciones de Desarrollo, Comités de Caminos y comunidad en general con un elevado grado de satisfacción en los proyectos desarrollados.

### Misión

La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal fungirá como secretaría técnica de la Junta Vial Cantonal en carácter de servicio de gestión vial en actividades financiadas en primera instancia por la Ley 8114 de Simplificación y Eficiencia Tributaria así como fondos que provengan de otros entes de financiamiento, para ser utilizados exclusivamente en actividades dirigidas a la conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento, rehabilitación, obra nueva, construcción y mejoramiento de puentes y casos de ejecución inmediata. En este caso se dará preferencia a la modalidad participativa de ejecución de obras definida como la coordinación y cooperación que se establece entre la Municipalidad, el Gobierno Central, Instituciones Públicas, Empresa Privada, las organizaciones comunales y la sociedad civil con la finalidad de planificar, ejecutar, controlar y evaluar obras físicas.





## Departamento de Gestión Vial Municipal

Funge como secretaría técnica de la Junta Vial Cantonal, dicha unidad se encarga de la Red Vial Cantonal por lo que, debe elaborar y ejecutar los planes y programas de conservación y de desarrollo vial, en concordancia con las políticas y directrices vigentes emitidas por el Concejo Municipal, la Junta Vial Cantonal, el MOPT entre otros. Dicha oficina se crea mediante Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, número 8114, publicada en alcance número 53 de la Gaceta número 131 (9 de julio de 2001).

Somos el departamento más grande de la Municipalidad con 58 funcionarios laborando por la Red Vial del Cantón. Contamos con un edificio alquilado para la oficina del departamento, ubicado 100 metros este y 150 metros norte del edificio Municipalidad, debidamente acondicionado para los funcionarios usuarios (área Social, área Administrativa y área Técnica)

Se contó nuevo personal de campo debido a la adquisición de maquinaria nueva, por lo que el contenido presupuestario del 2021 justificaba la existencia de más plazas en el departamento de Gestión Vial.

### **AJUSTAR - FOTO DEL EDIFICIO ROTULADO Y POR DENTRO**





## 1. Presupuestos y Planes de Trabajo

Para el periodo 2021 en cuanto a los recursos que maneja esta secretaría técnica, se aprobó un presupuesto ordinario y dos extraordinarios, todos respaldados en un mismo Plan Anual Operativo, cual consta de 19 metas referente a recursos provenientes de la Ley 8114 y Ley 9329 y recursos del préstamo con el IFAM, metas propuestas por la Junta Vial Cantonal para el cumplimiento de los objetivos, por tal razón a continuación se muestra un cuadro resumen de la Matriz del Plan Anual Aprobado para esos recursos.

### Presupuesto Ordinarios y Extraordinarios

Una vez aprobados los diferentes presupuestos, todos se unen como un solo presupuesto en nuestros sistemas contables, para un total presupuestado al finalizar el 2021 de ¢4.573.245.731,21, los cuales se desglosan de la siguiente manera:

Recursos 2021 Ley 8114-9329	¢2.944.876.963,00
Liquidacion 2020 2021 Ley 8114-9329	¢339.892.676,71
Recursospréstamo IFAM para 2021	¢1.288.476.091,50
Total presupuesto Ley 8114-9329 =====>	¢4.573.245.731,21





Municipalidad de Buenos Aires  
**Junta Vial Cantonal**  
 Departamento de Gestión Vial  
 Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

**Plan Anual Operativo para el periodo 2021 - Metas de Departamento de Gestión Vial**

PLANIFICACIÓN	PLANIFICACIÓN OPERATIVA							
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META		INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META		ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		No.	Descripción		I Semes	II Semes	I SEMESTRE	II SEMESTRE
Equipamiento, infraestructura y servicios	Contar con una UTGVM consolidada para el cumplimiento de sus funciones.	1	Ejecutar los recursos asignados para el funcionamiento del departamento de Infraestructura Vial en el periodo 2021.	Inversión de recursos	221.812.406,41	577.638.035,77	221.812.406,41	535.133.179,09
Equipamiento, infraestructura y servicios	Atender las necesidades de grupos organizados que por medio de CONVENIOS	2	Ejecutar 60 convenios con las comunidades, en el periodo 2021.	Número de kilómetros ejecutados.	35,00	25,00	4.930.000,00	3.570.000,00
Equipamiento, infraestructura y servicios	Dar mantenimiento MANUAL a proyectos ejecutados en el cantón.	3	Mantener limpios 10 km mensuales de vías cantonales, en el 2021.	Número de kilómetros ejecutados.	10,00	60,00	1.838.031,80	11.665.068,20
Equipamiento, infraestructura y servicios	Incrementar la flotilla de vehículos y maquinaria de la UTGVM.	4	Compra de 1 vehículo nuevo en el 2021.	Vehículo adquirido	-	1,00	0,00	25.000.000,00
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener en funcionamiento los vehículos y maquinaria de la GVM	5	Funcionar 230 días en el periodo 2021.	Días en funcionamiento	116,00	114,00	159.025.795,00	311.770.875,89
Equipamiento, infraestructura y servicios	Atender casos de ejecución inmediata que se presenten durante el 2021 en el cantón.	6	Atender el 100 % de las ejecuciones inmediatas que tengan acuerdo del Concejo Mucipal. En el 2021.	Porcentaje de emergencias atendidas	100,00	100,00	13.595.984,12	24.895.984,12
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	7	Mantenimiento Periódico de 417,44 km de vías cantonales; en el periodo 2021. (242,39 Km por Administración, 175,05 km por Contratación)	Número de kms intervenidos.	171,45	245,99	410.193.424,80	494.392.696,92
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	8	Rehabilitación de vías cantonales con la construcción de 80 PASOS de alcantarilla en el periodo 2021.	Número de pasos intervenidos.	27,00	53,00	81.000.000,00	167.692.801,47
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	9	Rehabilitación de 5 Alcantarillas de Cuadro en el periodo 2021.	Número de Alcantarilla de cuadro realizadas	1,00	4,00	42.052.128,76	125.287.198,53
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	10	Rehabilitación. Construcción de 4 proyectos de sistema de Red Pluvial Urbana, en el periodo 2021.	Números de proyectos ejecutados	1,00	3,00	122.000.000,00	141.606.433,96





Municipalidad de Buenos Aires  
**Junta Vial Cantonal**  
 Departamento de Gestión Vial  
 Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

PLANIFICACIÓN		PLANIFICACIÓN OPERATIVA						
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META		INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META		ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		No.	Descripción		I Semes	II Semes	I SEMESTRE	II SEMESTRE
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	11	Rehabilitación de 160 m2 de Cuneta Revestida en el periodo 2021.	Número de m2 intervenidos.	-	160,00	0,00	12.000.000,00
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	12	Rehabilitación de 952 ml de aceras en el periodo 2021.	Número de ml intervenidos.	652,00	300,00	76.754.095,65	6.127.685,00
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	13	Mejoramiento de vías cantonales, aplicando 4.476 m2 en TSB3, el periodo 2021.	Número de m2 intervenidos.	-	4.476,00	0,00	60.320.000,00
Equipamiento, infraestructura y servicios	Verificar las condiciones y necesidades de los puentes antes de su construcción.	14	Mejoramiento de vías cantonales, aplicando 403 toneladas de asfalto en el periodo 2021.	Número de TON aplicadas.	-	403,00	0,00	58.754.150,00
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	15	Compra de materiales para la Rehabilitación de Puentes, alcantarillado y aceras en el 2021.	Inversión de recursos	5.428.000,00	18.723.700,00	5.428.000,00	22.323.700,00
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	16	Contratar 6 permisos de extracción necesarios para el mantenimiento de caminos en el periodo 2021	Número de permisos solicitados.	2,00	4,00	1.200.000,00	19.400.000,00
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	17	Mantenimiento Rutinario a través de convenio MOPT-BID-MUNICIPALIDAD con microempresas (Contrapartida BID) en el periodo 2021.	Inversión de recursos	-	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00
Equipamiento, infraestructura y servicios	Verificar las condiciones y necesidades de los caminos y puentes antes de su construcción.	18	Contratar 6 estudios de diseños y estudios de Control de calidad necesarios para caminos y puentes en el periodo 2021	Cantidad de proyectos con estudios.	-	4,00	0,00	77.000.000,00
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	19	Finiquitar Proyectos del prestamo con el IFAM, con 1 compra Maqui, 1 Actualización de RED, 1 Estudio y diseño de edificio. En el periodo 2021.	Número de proyectos finiquitados.	-	3,00	0,00	1.288.476.091,50
<b>SUBTOTALES</b>							<b>1.139.829.866,54</b>	<b>3.433.415.864,67</b>
<b>TOTAL POR PROGRAMA</b>								<b>4.573.245.731,21</b>





## 2. Recursos Transferidos

Durante el 2020 a la Municipalidad de Buenos Aires se nos informó por la UNGL a través de la Mba. Karen Porras Arguedas en correo electrónico con fecha del 26-08-2020. que según lo indicado en el Cuadro Distrib Ley 8114 Municipalidades Anteproyecto 2021 Final del MOPT, los recursos provenientes de la Ley N° 8114 de Simplificación y Eficiencia Tributaria, modificado mediante Ley 9329, para el periodo 2021 correspondían al monto de ¢2.944.876.963,00.

Respecto a los recursos del préstamo con el IFAM N° 6-CVL-1457-07-18 se recibieron dos desembolsos para un total desembolsado de ¢1.114.485.203,92 más la comisión de ¢17.815.442,48 el total de la deuda al 31 de diciembre 2021 es de ¢1.132.300.646,4

## 3. Proyectos Programados

La Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Buenos Aires presupuestó un total de 156 proyectos para el 2021, distribuidos de la siguiente forma:

- 105 de Mantenimiento Periódico,
- 1 Mantenimiento Rutinario
- 48 de Rehabilitación (34 proyectos de pasos de alcantarillas, 5 alcantarillas de cuadro, 4 Red pluvial, 1 Cunetas Revestidas, 4 Aceras)
- 3 Mejoramientos.





#### 4. Ejecución de recursos, según Metas propuestas en Plan Anual Operativo.

Como mencionamos anteriormente, en cumplimiento con la directriz D-1-2002-CO-DFOE, se respalda en el Plan Anual Operativo del presupuesto municipal **19 metas** propuestas por la Junta Vial Cantonal con respecto a los recursos de la Ley N° 8114 – Ley N° 9329, sin embargo, dichas metas también son la base para el cumplimiento de los objetivos del Departamento de Gestión Vial Municipal; por lo que estas se enfocan desde el funcionamiento de la oficina, mantenimiento de maquinaria y varios tipos de obras viales e incluye los recursos obtenidos mediante el préstamo con el IFAM N° 6-CVL-1457-07-18 asignados para el 2021.

ORIGEN DEL RECURSO	PRESUPUESTADO	EJECUCIÓN	COMPROMISOS	SALDOS
Recursos Ley 8114- Ley 9329	€3.284.769.639,71	€2.432.835.821,58	€534.554.068,56	€317.379.749,57
Recursosnpréstamo IFAM para 2021	€1.288.476.091,50	€97.385.349,41	€0,00	€1.191.090.742,09
<b>Totales</b>	<b>€4.573.245.731,21</b>	<b>€2.530.221.170,99</b>	<b>€534.554.068,56</b>	<b>€1.508.470.491,66</b>

En el cuadro anterior se puede observar que para este 2022 quedaron recursos comprometidos por un total de €534.554.068,56 mismos que deben ser ejecutados durante el primer semestre 2022.

Respecto al préstamo del IFAM no se pudo concluir con la compra de Vagonetas y Asfaltados, toda vez que los concursos han tenido atrasos por apelaciones ante la CGR, además el proyecto de Asfaltado del Potrero Grande sí dará inicio en este 2022 ya se encuentra adjudicado.



Municipalidad de Buenos Aires  
Junta Vial Cantonal  
Departamento de Gestión Vial  
Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

Resumen de ejecución presupuestaria por meta

No.	Objetivo	Meta	Asignación	Ejecución	Copromiso	Saldo
1	Contar con una UTGVM consolidada para el cumplimiento de sus funciones.	Ejecutar los recursos asignados para el funcionamiento del departamento de Infraestructura Vial en el periodo 2021.	¢756.945.585,50	¢709.935.953,84	¢15.416.491,30	¢31.593.140,36
2	Atender las necesidades de grupos organizados que por medio de CONVENIOS	Ejecutar 60 convenios con las comunidades, en el periodo 2021.	¢8.500.000,00	¢8.500.000,00	¢0,00	¢0,00
3	Dar mantenimiento MANUAL a proyectos ejecutados en el cantón.	Mantener limpios 10 km mensuales de vías cantonales, en el 2021.	¢13.503.100,00	¢10.905.826,80	¢0,00	¢2.597.273,20
4	Incrementar la flotilla de vehículos y maquinaria de la UTGVM.	Compra de 1 vehículo nuevo en el 2021.	¢25.000.000,00	¢25.000.000,00	¢0,00	¢0,00
5	Mantener en funcionamiento los vehículos y maquinaria de la GVM	Funcionar 230 días en el periodo 2021.	¢470.796.670,89	¢322.787.017,29	¢55.632.780,76	¢92.376.872,84
6	Atender casos de ejecución inmediata que se presenten durante el 2021 en el cantón.	Atender el 100 % de las ejecuciones inmediatas que tengan acuerdo del Concejo Mucipal. En el 2021.	¢38.491.968,23	¢18.382.160,00	¢4.979.205,44	¢15.130.602,79
7	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Mantenimiento Periódico de 417,44 km de vías cantonales; en el periodo 2021. (242,39 Km por Administración, 175,05 km por Contratación)	¢904.586.121,72	¢553.460.855,01	¢255.911.985,52	¢95.213.281,19
8	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Rehabilitación de vías cantonales con la construcción de 80 PASOS de alcantarilla en el periodo 2021.	¢248.692.801,47	¢164.381.124,51	¢74.247.037,68	¢10.064.639,28
9	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Rehabilitación de 5 Alcantarillas de Cuadro en el periodo 2021.	¢167.339.327,29	¢96.264.873,05	¢71.041.735,19	¢32.719,05
10	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Rehabilitación. Construcción de 4 proyectos de sistema de Red Pluvial Urbana, en el periodo 2021.	¢263.606.433,96	¢262.385.359,26	¢0,00	¢1.221.074,70
11	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Rehabilitación de 160 m2 de Cuneta Revestida en el periodo 2021.	¢12.000.000,00	¢11.999.219,39	¢0,00	¢780,61
12	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Rehabilitación de 952 ml de aceras en el periodo 2021.	¢82.881.780,65	¢72.794.100,14	¢1.015.510,00	¢9.072.170,51
13	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Mejoramiento de vías cantonales, aplicando 4.476 m2 en TSB3, el periodo 2021.	¢60.320.000,00	¢53.228.274,29	¢0,00	¢7.091.725,71
14	Verificar las condiciones y necesidades de los puentes antes de su construcción.	Mejoramiento de vías cantonales, aplicando 768 toneladas de asfalto en el periodo 2021.	¢58.754.150,00	¢58.754.150,00	¢0,00	¢0,00
15	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Compra de materiales para la Rehabilitación de Puentes, alcantarillado y aceras en el 2021.	¢27.751.700,00	¢9.306.908,00	¢7.042.350,00	¢11.402.442,00
16	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Contratar 6 permisos de extracción necesarios para el mantenimiento de caminos en el periodo 2021	¢20.600.000,00	¢6.750.000,00	¢0,00	¢13.850.000,00
17	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Mantenimiento Rutinario a travez de convenio MOPT-BID-MUNICIPALIDAD con microempresas (Contrapartida BID) en el periodo 2021.	¢48.000.000,00	¢48.000.000,00	¢0,00	¢0,00
18	Verificar las condiciones y necesidades de los caminos y puentes antes de su construcción.	Contratar 6 estudios de diseños y estudios de Control de calidad necesarios para caminos y puentes en el periodo 2021	¢77.000.000,00	¢0,00	¢49.266.972,67	¢27.733.027,33
19	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	Finiquitar Proyectos del prestamo con el IFAM, con 1 compra Maqui, 1 Actualización de RED, 1 Estudio y diseño de edificio. En el periodo 2021.	¢1.288.476.091,50	¢97.385.349,41	¢0,00	¢1.191.090.742,09
<b>SUBTOTALES</b>			<b>¢4.573.245.731,21</b>	<b>¢2.530.221.170,99</b>	<b>¢534.554.068,56</b>	<b>¢1.508.470.491,66</b>





## 5. Resumen de la evaluación del Plan Anual Operativo en el 2021.

En el siguiente cuadro se puede observar un **resumen** correspondiente al PAO de los recursos asignados en el 2021, con cada una de las metas propuestas.

**Cuadro. Plan Anual Operativo de los recursos de la Ley 8114, Ley 9329.**

PLANIFICACIÓN	PLANIFICACIÓN OPERATIVA				EVALUACIÓN				
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META		INDICADOR	GASTO REAL POR META		EJECUCIÓN DE LA META	
			AREA ESTRATÉGICA	No.		Descripción	I SEMESTRE	II SEMESTRE	I Semes
Equipamiento, infraestructura y servicios	Contar con una UTGVM consolidada para el cumplimiento de sus funciones.	1	Ejecutar los recursos asignados para el funcionamiento del departamento de Infraestructura Vial en el periodo 2021.	Inversión de recursos	332.880.295,67	392.472.149,47	332.880.295,70	392.472.149,47	
Equipamiento, infraestructura y servicios	Atender las necesidades de grupos organizados que por medio de CONVENIOS	2	Ejecutar 60 convenios con las comunidades, en el periodo 2021.	Número de kilómetros ejecutados.	3.810.852,60	4.689.147,40	35,00	27,00	
Equipamiento, infraestructura y servicios	Dar mantenimiento MANUAL a proyectos ejecutados en el cantón.	3	Mantener limpios 10 km mensuales de vías cantonales, en el 2021.	Número de kilómetros ejecutados.	1.090.582,68	9.815.244,12	13,65	7,80	
Equipamiento, infraestructura y servicios	Incrementar la flotilla de vehículos y maquinaria de la UTGVM.	4	Compra de 1 vehiculo nuevo en el 2021.	Vehículo adquirido	0,00	25.000.000,00	-	1	
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener en funcionamiento los vehiculos y maquinaria de la GVM	5	Funcionar 230 días en el periodo 2021.	Días en funcionamiento	94.347.126,64	284.072.671,41	122,00	115	
Equipamiento, infraestructura y servicios	Atender casos de ejecución inmediata que se presenten durante el 2021 en el cantón.	6	Atender el 100 % de las ejecuciones inmediatas que tengan acuerdo del Concejo Mucipal. En el 2021.	Porcentaje de emergencias atendidas	10.827.863,50	12.533.501,94	80,00	86,6	





Municipalidad de Buenos Aires  
**Junta Vial Cantonal**  
 Departamento de Gestión Vial  
 Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021



PLANIFICACIÓN	PLANIFICACIÓN OPERATIVA				EVALUACIÓN			
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META		INDICADOR	GASTO REAL POR META		EJECUCIÓN DE LA META	
		No.	Descripción		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I Seme	II Seme
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	7	Mantenimiento Periódico de 417,44 km de vías cantonales; en el periodo 2021. (242,39 Km por Administración, 175,05 km por Contratación)	Número de kms intervenidos.	82.969.593,89	726.403.246,64	141,15	271,23
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	8	Rehabilitación de vías cantonales con la construcción de 80 PASOS de alcantarilla en el periodo 2021.	Número de pasos intervenidos.	0,00	238.628.162,19	-	80,00
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	9	Rehabilitación de 5 Alcantarillas de Cuadro en el periodo 2021.	Número de Alcantarilla de cuadro realizadas	2.102.128,76	165.204.479,48	-	5,00
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	10	Rehabilitación. Construcción de 4 proyectos de sistema de Red Pluvial Urbana, en el periodo 2021.	Números de proyectos ejecutados	65.641.177,66	196.744.181,60	1,00	3,00
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	11	Rehabilitación de 160 m2 de Cuneta Revestida en el periodo 2021.	Número de m2 intervenidos.	0,00	11.999.219,39	-	287,00
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	12	Rehabilitación de 952 ml de aceras en el periodo 2021.	Número de ml intervenidos.	66.682.422,14	7.127.188,00	650,00	300,00
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	13	Mejoramiento de vías cantonales, aplicando 4.476 m2 en TSB3, el periodo 2021.	Número de m2 intervenidos.	0,00	53.228.274,29	-	4.476,00
Equipamiento, infraestructura y servicios	Verificar las condiciones y necesidades de los puentes antes de su construcción.	14	Mejoramiento de vías cantonales, aplicando 403 toneladas de asfalto en el periodo 2021.	Número de TON aplicadas.	0,00	58.754.150,00	-	403,00





Municipalidad de Buenos Aires  
**Junta Vial Cantonal**  
 Departamento de Gestión Vial  
 Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021



PLANIFICACIÓN	PLANIFICACIÓN OPERATIVA				EVALUACIÓN			
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META		INDICADOR	GASTO REAL POR META		EJECUCIÓN DE LA META	
AREA ESTRATÉGICA		No.	Descripción		I SEMESTRE	II SEMESTRE	I Semes	II Seme
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	15	Compra de materiales para la Rehabilitación de Puentes, alcantarillado y aceras en el 2021.	Inversión de recursos	2.446.284,12	13.902.973,88	2.446.284,12	13.902.973,88
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	16	Contratar 6 permisos de extracción necesarios para el mantenimiento de caminos en el periodo 2021	Número de permisos solicitados.	637.000,00	6.113.000,00	2,00	3
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	17	Mantenimiento Rutinario a travez de convenio MOPT-BID-MUNICIPALIDAD con microempresas (Contrapartida BID) en el periodo 2021.	Inversión de recursos	0,00	48.000.000,00	-	48.000.000,00
Equipamiento, infraestructura y servicios	Verificar las condiciones y necesidades de los caminos y puentes antes de su construcción.	18	Contratar 6 estudios de diseños y estudios de Control de calidad necesarios para caminos y puentes en el periodo 2021	Cantidad de proyectos con estudios.	0,00	49.266.972,67	-	6,00
Equipamiento, infraestructura y servicios	Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año	19	Finiquitar Proyectos del prestamo con el IFAM, con 1 compra Maqui, 1 Actualización de RED, 1 Estudio y diseño de edificio. En el periodo 2021.	Número de proyectos finiquitados.	0,00	97.385.349,41	-	2,00
<b>SUBTOTALES</b>					<b>663.435.327,66</b>	<b>2.401.339.911,89</b>		
<b>TOTAL POR PROGRAMA</b>					<b>3.064.775.239,55</b>			





## 6. Procesos de Contratación.

En los procesos licitatorios se han realizado considerando las normas de ley General de Contratación Administrativa, misma que tuvo reforma en el periodo 2021

El Departamento de Gestión Vial tiene una ardua labor ya que los ingenieros y administradores de contratos del departamento trabajan en las especificaciones técnicas para los diferentes procesos licitatorios. Las mismas se incorporan en su momento al sistema informático SICOP, para sus respectivas aprobaciones.

Contamos con una Proveeduría Municipal muy competente que realiza la correspondiente inclusión de carteles, y documentos licitatorios y lleva control sobre los procesos hasta su adjudicación.

Los administrativos de Gestión Vial colaboran con la revisión de ofertas por lo que los ingenieros con su experiencia apoyan con la realización de los estudios técnicos y demás que sea necesario en el proceso, mismos que se realiza mediante SICOP.

Los contratos de obra con las empresas para el desarrollo de la obra física, servicios o compras, son confeccionados con la colaboración del departamento de Asesoría Legal de la Municipalidad, dichos contratos también son realizados en el sistema SICOP.

En la plataforma SICOP, queda documentada la información de todo el proceso, así como las respectivas recepciones y trámites de pago.



## 7. Ejecución de la Obra

En la Ejecución de obra se han vinculado y fusionado diferentes aspectos que han traído beneficios y parámetros a considerar en actuales y futuras tareas de desarrollo.

La parte técnica del departamento es el primero en llevar control sobre la ejecución de la obra, sin embargo en de suma importancia la intervención de área social, dónde nuestro promotor social mantiene el enlace tan importante con las comunidades.

Parámetros importantes a considerar:

- Participación de comunidades.
- Existencia de convenios comunales por cada proyecto
- Ejecución departamento de Gestión Vial
- Fiscalización de los proyectos por la parte técnica de Gestión Vial Municipal y las comunidades.
- Inclusión modelo de conservación vial participativa
- Evaluación de Satisfacción por el Proyecto
- Asambleas comunales ADI, Consejos Distritos y Comités de Caminos
- Inventarios de necesidades participativos
- Programa de Divulgación, capacitación, evaluación y seguimiento.



## 8. Inventario de maquinaria y vehículos en uso.

	MAQUINARIA	PLACA
1	LOW BOY PEQUEÑO	SM 7322
2	LOW BOY GRANDE	SM 5133
3	CABEZAL	SM 5134
4	VAGONETA	SM 4603
5	VAGONETA	SM 4604
6	VAGONETA	SM 4620
7	COMPACTADORA	SM 8270
8	COMPACTADORA	SM 8269
9	COMPACTADORA	SM 4466
10	NIVELADORA	SM 8267
11	NIVELADORA	SM 8268
12	NIVELADORA	SM 4574
13	RETROEXCAVADORA BACK HOE	SM 4613
14	RETROEXCAVADORA BACK HOE	SM 8123
15	RETROEXCAVADORA BACK HOE	SM 8127
16	TRACTOR DE ORUGAS	SM 8125
17	TRACTOR DE ORUGAS	SM 8126
18	TRACTOR DE ORUGAS	SM 6981
19	CARGADOR	SM 3371
20	EXCAVADORA	SM 8271

	VEHICULOS	
1	CUADRA	SM 5067
2	BEGO VIEJO BLANCO	SM 5078
3	RUSH NUEVO	SM 7273
4	PALOMO	SM 6443
5	BEGO INSPECTORES	SM 6649
6	LAMCRUISER	SM 7275
7	LAMCRUISER	SM 6665
8	MITSUBICHI	SM 4587
9	TOYOTA-NUEVO	SM 7407
10	TOYOTA-NUEVO	SM 7406
11	KIA	SM 5094
12	HINO	AGV-906



## 9. Promoción Social

La Promoción Social se sitúa como un **área del Trabajo Social** encaminada a promover la participación de un sujeto y/o un colectivo de población que presenta una necesidad y/o problemática en particular, de forma organizada y comprometida, con el objetivo de generar cambios sociales a través de la movilización. Según estos procesos de movilización la gestión social se ha centrado en los siguientes elementos, que a continuación se indican.

### Plan de Capacitación

El plan de capacitación cuenta con cuatro áreas fundamentales para desarrollar en el Cantón de Buenos Aires, a Saber:

- A. Rehabilitación Vial
- B. Mantenimiento Vial
- C. Fortalecimiento Institucional
- D. Fortalecimiento Organizacional

### Plan de Capacitación 2021

#### A: Rehabilitación Vial

Código	Temas
A.2	Elementos del Sistema de Drenaje y su Funcionamiento.
A.3	Fabricación, colocación de tuberías y construcción de Cabezales.
A.4	Rehabilitación de superficie de ruedo de caminos expuestos.
A.5	Plan de Control de Calidad.
A.6	Construcción de Aceras
A.7	Ingresos a casas tubería
A.8	Movilización de Postes





#### B: Mantenimiento Vial

Código	Temas
B.1	Mantenimiento manual.
B.2	Mantenimiento rutinario y periódico.

#### C: Fortalecimiento Institucional

Código	Temas
C.5	Formación Escolar.
C.7	Asesoramiento, Art., 5b. Ley 8114.
C.8	Conceptos básicos sobre comunicación.
C.9	Plan Quinquenal
C.10	Revista Digital

#### D: Fortalecimiento Organizacional

Código	Temas
D.1	Información sobre programa BID.
D.2	Situación de la Red Vial
D.3	Inducción en conservación vial participativa.
D.4	Inventario Vial de necesidades.
D.5	Organización para el Trabajo Gestión Vial
D.6	Formación Escolar.
D.7	Fiscalización social de obras viales.
D.8	Generación de recursos para la conservación vial.
D.9	Salud Ocupacional

### **Personas Capacitadas**

La forma de trabajo a ejecutar ha sido el tipo taller en actividades que van de dos a tres horas en donde se realiza el desarrollo de varios temas con un hilo conductor con el apoyo de proyector multimedia, computadora y material digitalizado y preparado para la comunidad, con su respectiva agenda de trabajo y lista de participantes para llevar el control de las actividades de capacitación.





### Principales Temas Abordados y Población Capacitada

Tema	Hombres	Mujeres	Total
Salud Ocupacional MMEC/Municipalidad	49	34	83
Inducción MMEC	14	7	21
Inducción MMEC Concejo (varias)	14	8	22
Plan Quinquenal Concejo	10	3	13
Plan Quinquenal Consulta Comunal	95	37	132
Mantenimiento Manual MMEC/Municipalidad	45	17	62
Mantenimiento rutinario y periódico	42	9	51
Organización trabajo gestión vial	123	53	176
Fabricación, colocación de tuberías y construcción de Cabezales.	25	14	39
Rehabilitación de superficie de ruedo de caminos expuestos.	22	10	32
Integración de Personal	--	--	53
Construcción de Aceras	23	13	36
Ingresos a casas tubería	3	3	6
Movilización de Postes Coord. ICE	3	0	3
Revista Digital	2	1	3
Situación de la Red Vial Cantonal	38	9	47
<b>Totales</b>	<b>508</b>	<b>218</b>	<b>779</b>

Fuente: Listas de asistencia por actividad 2021.

### Material Didáctico

En lo que respecta al material didáctico se han preparado varios módulos de capacitación para ser desarrollados con los diferentes grupos poblacionales, en cada módulo se elaboró una agenda en donde se especifica el objetivo a desarrollar, temas a tratar, tiempo por tema y total, material y responsable con el fin de dar un ordenamiento lógico a la actividad.

Se desarrollaron módulos en los temas de: Asesoramiento, Art, 5b. Ley 8114, Procesos de Divulgación Social, Factores de Riesgo en Adolescentes y Jóvenes Conductores, Unidad Técnica de Gestión Vial resultados de encuesta, Plan Control de Calidad, Caminos MOPT/BID, organización comunal, Organización para Comités de Caminos, Elementos del sistema de drenaje



y su funcionamiento, elementos básicos del funcionamiento de la Unidad Técnica, Desarrollo Social y Fiscalización Social de Obras.

### Divulgación

Medio	Cantidad	Coordinación
Revistas digitales	2	Se elaboraron dos revistas digitales una de la MMEC y otra tipo rendición adelantada en noviembre sobre DGVM. Se compartieron digitalmente con todos los grupos organizados y personas físicas.
Programas de Radio	8	Radio Cultural de Buenos Aires el programa se llama RVC 88.1 significa Red Vial Cantonal y la frecuencia. Se pasan los programas en Facebook Live.
Invitaciones Digitales	10	Se pasan por medios de correo, wsp, FB a los diferentes grupos organizados y personas físicas claves de la organización.
Afiches Rendición de cuentas	18	Por distrito

En los meses de noviembre y diciembre del 2021 se ha estado desarrollando un programa de Radio denominado RVC.88.1 que significa Red Vial Cantonal semanalmente los miércoles a las 11 a.m. la idea es informar de las diferentes actividades de Gestión Vial desarrolladas en los 9 distritos del cantón de Buenos Aires en las modalidades de Administración y Contratación para la ejecución de los proyectos y explicados en esta misma revista.





Estos son dos de los programas llevados a cabo en la foto del lado izquierdo se observan representantes de los Barrios Mena y Las Rosas en donde se desarrollaron proyectos de aceras uno por administración y otro por contratación, se expuso el proceso y principales aciertos y desaciertos. En la foto de la derecha se desarrolló el tema de la MMEC de Biolley con representantes de la Junta directiva ambos programas están en la página WEB de la Municipalidad en la Sección del Departamento de Gestión Vial Municipal. A partir del 2022 el programa se seguirá transmitiendo mensualmente el último miércoles de mes para que nos sigan acompañándonos e informándose. El programa se desarrolla por Rudy Fdo. Pérez Astorga Promotor Social G.V.M.

### Revistas Digitales Elaboradas en Divulgación



Esta es la primera revista digital elaborada para este año se elaborará una por trimestre.



Esta segunda revista digital trata sobre la propuesta de la Microempresa que se está desarrollando en el distrito de Biolley sobre el Mantenimiento Manual por Estándares Comunitarios (MMEC), se pueden ubicar en la página de la Municipalidad de Buenos Aires en la información referente al Departamento de Gestión Vial Municipal.



Este es el tipo de invitación digital que se utiliza en forma digital, se elaboran y se comparten por WhatsApp, correo o cualquier tipo de forma digital que los clientes de nuestros servicios usen, en este caso el más usado es el WhatsApp.

## Material Didáctico

Dentro del material elaborado existen 6 desplegados resumen de las principales actividades de la Unidad Técnica, a saber:

- Desplegado No. 1 Información General Unidad de Gestión Vial Municipal. Se indica que es, quiénes la conforman y que es la Junta Vial Cantonal.
- Desplegado No. 2 Plan de Capacitación 2005. Habla de las áreas y temas a desarrollar.
- Desplegado No. 3 Comités de Caminos. Trata sobre que son, funciones, requisitos, forma de elección, vigencia, junta directiva entre otros.
- Desplegado No. 4 Organización Escolar en conservación vial. Habla sobre patrullas escolares, actividades, forma de capacitación y es dirigido a niños y niñas en primera instancia.



- Desplegado No. 5 Partes del Camino. Se presentan las partes del camino y sistema de drenaje y Control de calidad.
- Desplegado No. 6 Conservación vial. Trata sobre que es, actividades que comprende, lo que no comprende entre otros.


### Comités de Caminos

Los Comités de Caminos son grupos organizados, formados por hombres, mujeres, niños y niñas, cuyo objetivo prioritario es velar por que los caminos de su comunidad se mantengan en buenas condiciones y por tanto transitables todo el año.

### Total de Comités Existentes

En el cantón de Buenos Aires al momento de realizar el presente documento existen 98 comités de caminos distribuidos de la siguiente forma por distrito.

**Gráfico No. 1**  
**Comités de Caminos por Distrito 2021**  
(datos Porcentuales)

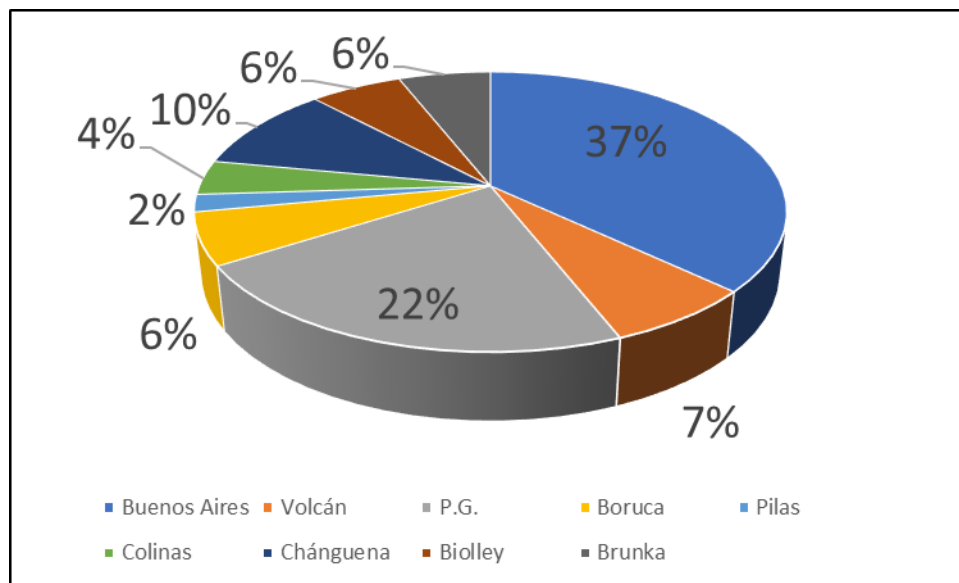

Fuente: Área Social de Gestión Vial Municipal 2021.



No.	Distritos	Real	Porcentual
1	Buenos Aires	66	37%
2	Volcán	12	7%
3	P.G.	38	22%
4	Boruca	11	6%
5	Pilas	4	2%
6	Colinas	7	4%
7	Chánguena	17	10%
8	Biolley	10	6%
9	Brunka	10	6%
	<b>Total</b>	<b>175</b>	<b>100%</b>

Se ha trabajado en la organización de los comités de caminos que corresponden a alguna programación y cuentan con presupuesto definido más que con los que no están en programación, la fase que sigue es precisamente el control y asesoramiento de los ya existentes en el cantón para asegurar su funcionalidad en el trabajo a realizar a nivel comunal. En la Actualidad los Concejos de Distrito han asumido una posición directiva en los procesos de infraestructura vial en los distritos facilitando la coordinación y trabajo con las Asociaciones de Desarrollo Integral y los comités de caminos los cuales quedan a cargo de las Asociaciones de Desarrollo Integral con el Asesoramiento y dirección de la Municipalidad a través del departamento de Gestión Vial Municipal.

**Proyectos Ejecutados por el Programa MOPT-BID en el cantón (los montos son en millones de colones y estimados).**

Distrito	Código Camino	Descripción	Situación	Estado
Buenos Aires	6-03-008	Brujo-Brisas	Asfalto	Ejecutado con elementos de mejora por hacer
Brunka	6-03-035	Rancho de Coco	Tratamiento Superficial	Ejecutado con elementos de mejorar por hacer

Fuente: Área Social Gestión Vial Municipal 2022.





### Acciones Realizadas en el 2021 en el Programa MOPT-BID proyectos por ejecutar 2022

Código	Acciones Realizadas por Área Social
6-03-012	Se ha definido el derecho de vía y sitios como escombreras, se tiene seguimiento con respecto al acueducto y los recursos necesarios para asegurar el apoyo al proyecto. Se cuenta aval del Concejo Municipal, Consejo de Distrito y Asociaciones con respecto al trabajo a realizar, cuenta con auditoria se seguridad Vial.
6-03-027	Se ha definido el derecho de vía y sitios como escombreras, se tiene seguimiento con respecto al acueducto y los recursos necesarios para asegurar el apoyo al proyecto. Se cuenta aval del Concejo Municipal, Consejo de Distrito y Asociaciones con respecto al trabajo a realizar, cuenta con auditoria se seguridad Vial.

### Acciones Realizadas en el 2021 en Gestión Vial

Aportes	Acciones Realizadas por Área Social
Plan Quinquenal	Se realizó la coordinación con los Consejos de Distrito, ADI y Comités de caminos en donde se definieron en forma participativa y con criterios técnicos los procesos a seguir. Se estableció un trabajo diferencia entre las comunidades indígenas y las comunidades no indígenas respetando su cultura y necesidades planteadas. Por lo cual a cada grupo indígena se atendió en reuniones diferenciadas y posteriormente se les entrego la información a cada uno.
Actualización de la Red Vial Cantonal	La actualización de la Red Vial no es un proceso terminado está en constante movimientos y cambios, se trabajó muchos grupos organizados en constantes reuniones y coordinaciones en las comunidades, en estos momentos todos los ajustes que se tengan que realizar quedan a cargo del Departamento de Gestión Vial.
Reglamento de Mantenimiento Manual y definición de tasas	En Reglamento sigue activo y funcionando con su respectivo instrumental de aplicación los inspectores de proyectos con elementos claves en su aplicación y el área social la encargada de atender todas las dificultades que se establezcan a nivel social. Cuando se aplican las notificaciones los vecinos por lo general acatan lo indicado.
Comisión de Salud Ocupacional	En esta comisión se crea el documento madre que guía las acciones con sus respectivos instrumentos, se realizan giras de campos con el fin de monitorear y asesorar al personal del campo en pro de un adecuado proceso de trabajo en seguridad vial.
Comisión de Integración Personal	Se elabora estudio de Clima Organizacional interno que facilita la definición de una serie de actividades que faciliten la integración del personal entre ellos y sus departamentos en un ambiente amigable y cortés facilitando el establecimiento de lasos de colaboración y apoyo. Se presenta programa anual de actividades a realizar.
Elaboración de Acuerdos de	Se elaboran 69 acuerdo de coordinación con las comunidades para desarrollar diferentes tipos de proyectos viales indicando las





Municipalidad de Buenos Aires  
**Junta Vial Cantonal**  
Departamento de Gestión Vial  
Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

coordinación comunales	responsabilidades tanto de la comunidad como de la Municipalidad. En total por aportes comunales de todos los acuerdos de coordinación se tiene que el aporte comunal fue de 18.193.638 millones de colones.
Evaluación Impacto de construcción Aceras	Instrumento que facilita la revisión de la percepción de los beneficiarios del proyecto, en este caso se aplica en Barrio Las Rosas y Barrio Mena obteniendo excelentes resultados validados por cada propietario.
Movilización de Postes en forma conjunta con el ICE	Se realiza coordinación con el ICE, para lo cual se define gira y seguimiento, ya se cuenta con inventarios de postes a movilizar y coordinación a futuro para que nuevos proyectos de caminos no cuenten con este problema, implica una inversión muy alta para el ICE pero ya lo están estableciendo en programación para el 2024 lo ubicado el año pasado que fueron 33 postes que obstaculizan el adecuado paso.
Microempresa para el Mantenimiento Manual	A nivel social se es el encargado de brindar seguimiento y asesoramiento a este programa en forma conjunta con representantes del BID, se realizan giras mensuales, proceso de capacitación con diferentes organizaciones e instituciones, se tiene un proceso muy sólido y estable en mantenimiento manual en Biolley y se está por arrancar con obra gris a nivel de aceras.
Declaratoria de caminos públicos	Presentación de instrumento y aprobación del Concejo Municipal para la declaratoria de caminos públicos según la normativa vigente y en forma coordinada con los inspectores de trabajo, se aplica en Ujarras en el paso de Guanacaste con muy buenos resultados a nivel interno y externo al cantón.
Pasos de Alcantarilla	Se crea instrumento que facilite la salidas de aguas en propiedades privadas según leyes vigentes para facilitar la toma de decisiones y coordinador con los propietarios su aval.
Seguridad Vial	En materia de señalización vertical y horizontal se siguen elaborando los inventarios de necesidades y aportando los presupuestos y seguimiento en los proyectos viales. Se elaboraron en Biolley, Chánguena, Brujo a Brisas, Ancho de Coco.
Digitalización de comités de caminos	Registro digital de los comités de caminos existentes en el cantón como recurso comunal de apoyo.
Evaluación de Impacto social de proyectos	Según la Evaluación de Impacto Social de Proyectos se alcanzó un 90% de satisfacción por todas las obras llevada a cabo en el 2021.
Atención de denuncias	La atención de denuncias se sigue llevando en forma conjunta con los inspectores de proyectos. En el 2021 se atendieron 17 denuncias, relacionadas con problemas de agua, señales tapadas, problemas salidas aguas, alcantarillas, mantenimiento manual, obras realizadas, asesoramientos entre otros.
Ruta del Agua	Se apoyó a la propuesta brindando las imágenes de los caminos involucrados con el proyecto que se está desarrollando por parte del INDER y el departamento de Desarrollo Local de la Municipalidad, realizando una explicación en reunión virtual de las principales características de cada camino y entregando la información solicitadas.





Municipalidad de Buenos Aires  
**Junta Vial Cantonal**  
 Departamento de Gestión Vial  
 Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

## 10. Desglose de intervención en Obra Vial según programación 2021

Se presenta desglose de los proyectos programados por código de camino, para realizar por Administración y por Contratación.

### Mantenimiento periódico

CAMINO	NOMBRE		MONTO	EJECUCIÓN	Compromisos	SALDO PRES	Km
	<b>MAQUINARIA MUNICIPAL</b>		<b>¢478.672.663,01</b>	<b>¢281.524.164,15</b>	<b>¢107.619.217,68</b>	<b>¢89.529.281,18</b>	<b>229,73</b>
6-03	368	(ENT.C.49) YERI,PLAZA ESCUELA RIO AZUL,RES.INDIG	¢10.563.300,00	¢10.563.298,00		¢2,00	4,20
6-03	352	(ENT.C.63) BRISAS ABAJO SANTA ELENA,RIO CABAGRA	¢24.972.685,00	¢28.970.016,00		¢3.997.331,00	7,00
6-03	038	CALLES URBANAS - CUADR BUENOS AIRES,PUNTARENAS.	¢14.773.197,44	¢14.697.563,00		¢75.634,44	9,00
6-03	190	(ENT.N.2) CRUCE EL CEIBO CARACOL CHIQUITO-RIO GENE	¢19.632.952,00	¢19.632.952,00	¢0,00	¢0,00	7,00
6-03	005	(ENT.C.8) CRUCE STA.EDU PARCELAS IDA	¢5.844.633,00	¢5.844.633,00	¢0,00	¢0,00	1,10
6-03	002	(ENT.C.38)CRUCE SALITRE UJARRAZ,PLAZA DEPORTES	¢5.471.540,00	¢5.471.540,00	¢0,00	¢0,00	3,00
6-03	080	(ENT.C.2) PLAZA UJARRAS FCA. ESPOSORIO ARAUZ	¢12.880.192,00	¢12.880.192,00	¢0,00	¢0,00	10,00
6-03	007	(ENT.N.2)EL BRUJO (ENT.C.65) CRUCE ALTO CALD	¢1.725.000,00	¢0,00	¢1.725.000,00	¢0,00	11,50
6-03	049	(ENT.C.2)BUENOS AIRES (ENT.C.368) YERY-RESERV.IND	¢5.728.696,00	¢5.727.696,00		¢1.000,00	5,90
6-03	185	(ENT.C.26) SAN CARLOS BAJO QUEBRADA LOS LOPEZ	¢4.816.000,00	¢0,00	¢4.816.000,00	¢0,00	1,60
6-03	195	(ENT.N.2) BUENOS A.SODA (ENT.C.194) PARAISO	¢5.237.750,00	¢0,00	¢5.237.750,00	¢0,00	4,10
6-03	362	(ENT.C.2) UJARRAS CERRO BRUNKA	¢900.000,00	¢0,00		¢900.000,00	-
6-03	126	(ENT.C.38) BUENOS AIRES (ENT.C.26) PLATANARES	¢5.975.000,00	¢0,00	¢5.974.500,00	¢500,00	6,00
6-03	173	(ENT.N.610) BUENOS AIRES (ENT.N.2) EL CEIBO	¢10.865.614,35	¢10.860.842,15		¢4.772,20	4,60
6-03	006	(ENT.N.2)CONVENTO TRES RIOS-FCA.STA. FE	¢8.503.612,00	¢3.953.307,00		¢4.550.305,00	4,55
6-03	094	(ENT.N.2) SONADOR FCA. GERARDO CORRALES	¢3.065.000,00	¢2.886.807,00		¢178.193,00	1,00
6-03	093	(ENT.N.2) CONVENTO FCA. ISIDRO MADRIGAL	¢3.719.289,07	¢639.640,00		¢3.079.649,07	0,52
6-03	101	(ENT.N.2) CONVENTO PLAZA DEP. CONVENTO	¢2.231.250,00	¢1.254.160,00		¢977.090,00	0,30
6-03	023	(ENT.C.117)CUADRANTES VOLCANCITO	¢14.819.000,00	¢11.898.766,00		¢2.920.234,00	15,40
6-03	112	(ENT.C.23) ALTAMIRA RIO CONVENTO LMTE.CANTON	¢10.597.500,00	¢8.611.527,00		¢1.985.973,00	3,00
6-03	134	CALLES URBANAS - CUADR URB. EL PEREGRINO	¢2.472.750,00	¢1.483.930,00		¢988.820,00	0,93
6-03	013	(ENT.N.2) CRUCE CACAO,ES (ENT.C.23) CRUCE CORDONCI	¢11.263.794,00	¢11.263.794,00		¢0,00	4,10
6-03	073	(ENT.N.610) VOLCAN (ENT.N.2) CACAO	¢5.400.871,00	¢5.400.871,00		¢0,00	3,00
6-03	024	ENT.N.2)CRUCE TARICE (ENT.C.23)CRUCE CORDONCI	¢14.606.400,00	¢9.917.422,00		¢4.688.978,00	4,40
6-03	017	(ENT.N.2)CRUCE PEJE (ENT.C.3) CRUCE LAS BOLAS	¢2.444.080,00	¢2.444.080,00		¢0,00	1,00
6-03	108	CALLES URBANAS - CUADR POBLACION PEJE - VOLCAN	¢935.000,00	¢174.250,00		¢760.750,00	0,50
6-03	059	(ENT.N.2)CONVENTO. PUENTE RIO CONVENTO LMTE	¢1.883.125,00	¢1.310.110,00		¢573.015,00	0,50
6-03	092	(ENT.N.2) CONVENTO (ENT.C.6) TARICE	¢3.013.000,00	¢1.928.900,00		¢1.084.100,00	1,00
6-03	033	(ENT.N.2)CRUCE STA. MART PARQUE INTERNACIONAL AMIS	¢46.637.500,00	¢0,00	¢43.242.459,00	¢3.395.041,00	13,00
6-03	158	(ENT.C.35) SAN RAFAEL RIO CAÑAS - SAN RAFAEL	¢1.878.635,15	¢0,00	¢1.870.908,68	¢7.726,47	0,50
6-03	147	(ENT.C.145) BARRIO PEDRE FCA. GUIDO ROJAS	¢7.305.000,00	¢0,00	¢2.997.500,00	¢4.307.500,00	1,20
6-03	146	(ENT.C.145)BARRIO PEDRE CERRO SANTA LUCIA	¢9.186.250,00	¢9.113.894,00		¢72.356,00	2,70
6-03	031	CALLES URBANAS - CUADR POTRERO GRANDE,BUENOS A	¢11.157.987,00	¢11.155.987,00		¢2.000,00	5,00
6-03	011	ENT.C.31)POTRERO GDE.PI (ENT.C.27) BAJO SABALO	¢900.000,00	¢900.000,00		¢0,00	3,00
6-03	043	(ENT.N.237)LA PITA (ENT.C.304) ALTO GUACIMO	¢8.628.807,00	¢8.605.007,00		¢23.800,00	3,00
6-03	042	(ENT.N.237) GUACIMO FCA.ELIECER CHACON-MONTE	¢5.565.625,00	¢5.540.285,00		¢25.340,00	2,00
6-03	004	(ENT.C.9)ALTO LA CRUZ. CAPRI,PLAZA,ESCUELA	¢20.880.000,00	¢0,00	¢7.000.000,00	¢13.880.000,00	16,00
6-03	063	(ENT.C.8 Y 21) BRISAS,SN.R (ENT.C.4) LA CAPRI	¢20.887.604,00	¢18.799.409,00		¢2.088.195,00	13,00
6-03	342	(ENT.C.63) SAN RAFAEL LAS JUNTAS, RIO PIEDRA	¢6.910.756,00	¢6.910.756,00		¢0,00	2,80
6-03	343	(ENT.C.63) SAN RAFAEL CAN FCA. JOSE ROJAS	¢4.819.500,00	¢3.368.515,00		¢1.450.985,00	2,10
6-03	060	(ENT.N.237)VUeltas,TAMAR (ENT.C.68) CHANGUENA	¢3.090.750,00	¢0,00		¢3.090.750,00	-
6-03	214	(ENT.N.237) PASO REAL CEM. PASO REAL	¢1.405.000,00	¢0,00		¢1.405.000,00	-
6-03	233	(ENT.N.237) LAS VUeltas FCA. RAFAEL MORA	¢9.490.000,00	¢0,00		¢9.490.000,00	-
6-03	238	(ENT.N.2) CATARATAS (ENT.237) IGLESIA TERRABA	¢13.832.402,00	¢13.832.402,00		¢0,00	2,30
6-03	239	(ENT.C.237) IGLESIA TERRA CEM. TERRABA	¢2.063.734,00	¢2.063.734,00		¢0,00	0,80





Municipalidad de Buenos Aires  
**Junta Vial Cantonal**  
 Departamento de Gestión Vial  
 Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

CAMINO	NOMBRE	MONTO	EJECUCIÓN	Compromisos	SALDO PRES	Km
6-03 222	(ENT.C.61) LA LUCHITA FCA. EVELIO ROJAS	¢2.282.500,00	¢0,00		¢2.282.500,00	-
6-03 009	(ENT.N.237) POTRERO GRA PUEBLO NUEVO-FCA. HELECH	¢7.593.750,00	¢0,00		¢7.593.750,00	-
6-03 384	(ENT. C. 9 ) PUEBLO NUEVO ( ENT. C. 9 ) PUEBLO NUEVO	¢1.000.000,00	¢0,00		¢1.000.000,00	-
6-03 021	(ENT.C.8.63)ALTO LAS BRIS (ENT.C.36) POTRERO GRANDE	¢13.200.000,00	¢11.199.340,00		¢2.000.660,00	13,00
6-03 012	ENT.N.237)P.REAL,CHANG.S RIO LIMON,LMTE.CANTONAL S.	¢3.564.652,00	¢2.564.652,00		¢1.000.000,00	10,00
6-03 332	(ENT.C.63) LAS BRISAS FCA. SAUL CALDERON	¢3.781.275,00	¢281.275,00		¢3.500.000,00	0,20
6-03 029	PARAISO DE CHANGUENA RESERVA INDIGENA GUAYMI	¢729.680,00	¢729.680,00		¢0,00	5,60
6-03 045	(ENT.C.9) ALTO LA CRUZ (ENT.C.218) EL TREBOL	¢1.434.740,00	¢1.429.240,00		¢5.500,00	1,40
6-03 218	(ENT.C.9) PUEBLO NUEVO-( ENT.C.9) PUEBLO NUEVO	¢1.765.285,00	¢1.759.785,00		¢5.500,00	1,25
6-03 066	(ENT.C.29) PARAISO (ENT.C.12) SAN LUIS	¢1.500.000,00	¢0,00		¢1.500.000,00	-
6-03 377	(ENT.C.379) SABANA MAMEY (ENT.C.379) ZAPOTAL	¢1.000.000,00	¢0,00		¢1.000.000,00	-
6-03 114	(ENT.C.23) ALTAMIRA FCA. LOS CALVO	¢2.500.000,00	¢0,00	¢984.600,00	¢1.515.400,00	3,20
6-03 115	(ENT.C.23) CORDONCILLO FCA. RUBEN SANCHEZ	¢2.000.000,00	¢124.000,00		¢1.876.000,00	0,80
6-03 367	(ENT.C.49) YERI (ENT.C.41) DURICA	¢14.300.000,00	¢0,00	¢14.299.500,00	¢500,00	1,80
6-03 402	( ENT.C. 41 ) PALMITAL - YER YERY - ESCUELA	¢4.080.000,00	¢0,00	¢4.075.500,00	¢4.500,00	0,50
6-03 424	(ENT.R625) LICEO MAIZ DE FCA. RDGAR CAMACHO	¢4.000.000,00	¢0,00		¢4.000.000,00	-
6-03 194	FINCAS RIO GRANDE BUEN RIO GENERAL-POCHOTE"C.AN	¢5.325.000,00	¢0,00	¢5.325.000,00	¢0,00	0,70
6-03 193	(ENT.C.191) LA CHIRIPA (ENT.C.194) LAS ANIMAS	¢5.325.000,00	¢0,00	¢5.325.000,00	¢0,00	0,70
6-03 624	(ENT C 59) CONVENTO, KM (ENT C 101) CONVENTO, KM 0-	¢1.500.000,00	¢661.707,00		¢838.293,00	0,52
6-03 134	CALLES URBANAS - CUADR URB. EL PEREGRINO	¢2.500.000,00	¢0,00		¢2.500.000,00	-
6-03 002	(ENT.C.38)CRUCE SALITRE UJARRAZ,PLAZA DEPORTES	¢3.060.000,00	¢3.060.000,00		¢0,00	6,30
6-03 091	CUADRANTE URBANO CEIB CUADRANTE URBANO CEIBA	¢2.500.000,00	¢1.608.200,00		¢891.800,00	0,40
6-03 010	(ENT N 610) CRUCE SAN RA (ENT C 33) LLANO BONITO, KM	¢500.000,00	¢0,00	¢500.000,00	¢0,00	0,50
6-03 707	(ENT N 610) CRUCE SAN RA (ENT C 33) LLANO BONITO, KM	¢500.000,00	¢0,00	¢500.000,00	¢0,00	0,50
<b>MAQUINARIA CONTRATADA</b>						
	<b>Mantenimiento Periódico del Distrito de Boruca</b>	<b>¢109.378.650,00</b>				
6-03 310	(ENT.N.2) CHANGUENITA,CU (ENT.C.312) BORUCA"BAR BOF	¢11.851.171,56	¢0,00	¢11.851.171,56	-	7,70
6-03 312	CALLES URBANAS - CUADR POBLACION BORUCA	¢4.294.875,00	¢0,00	¢4.294.875,00	-	1,20
6-03 315	(ENT.C.56) BORUCA QUEBR. HONDA-MAYAL	¢25.334.062,50	¢0,00	¢25.334.062,50	-	5,60
6-03 056	(ENT.N.625)ALTO SAN JOAQ (ENT.C.312) BORUCA	¢13.732.250,00	¢0,00	¢13.732.250,00	-	3,50
6-03 057	(ENT.N.625)BELLA VISTA (ENT.C.3) TERRABA	¢46.428.690,94	¢0,00	¢46.428.690,94	-	9,50
6-03 058	(ENT.N.625)OJO DE AGUA. TRES RIOS,ESCUELA	¢7.737.600,00	¢0,00	¢7.737.600,00	-	1,20
	<b>Mantenimiento Periódico del Distrito de Changuena</b>	<b>¢58.241.510,00</b>				
6-03 022	(ENT.C.12)CHANGUENA,BOI (ENT.C.390) STA. LUCIA	¢4.965.000,00	4.070.000,00		895.000,00	5,50
6-03 012	ENT.N.237)P.REAL,CHANG.S RIO LIMON,LMTE.CANTONAL S.	¢23.318.913,44	22.734.860,00		584.053,44	18,70
6-03 379	(ENT.C.378) LA BONGA LAS VEGAS,RIO TERRABA	¢8.659.000,00	8.288.000,00		371.000,00	11,20
6-03 378	(ENT.C.22) LA BONGA,CANT (ENT.C.377) BAJO MAMEY	¢1.890.000,00	1.776.000,00		114.000,00	2,40
6-03 050	(ENT.C.12)PASTATE (ENT.C.379) ZAPOTAL	¢3.194.000,00	2.812.000,00		382.000,00	3,80
6-03 066	(ENT.C.29) PARAISO (ENT.C.12) SAN LUIS	¢5.300.821,56	4.400.000,00		900.821,56	5,00
6-03 087	(ENT.C.12) CHANGUENA CEMENT. CHANGUENA	¢1.661.250,00	1.396.000,00		265.250,00	0,40
6-03 068	(ENT.C.12) CHANGUENA LA (ENT.C.12) PILON	¢4.153.125,00	3.421.250,00		731.875,00	1,00
6-03 086	(ENT.C.12) PILON FCA.JOQUIN VARGAS	¢5.099.400,00	5.099.400,00		-	1,00
	<b>Mantenimiento Periódico del Distrito de Biolley</b>	<b>¢114.535.415,86</b>				
6-03 027	N.237)GUACIMO,TABLAS,RIC ALTO SABALO(ENT.C.37) ALTAN	¢36.352.234,61	36.352.234,61		0,00	13,00
6-03 037	(ENT.C.282)BIOLLEY,COLOR ALTAMIRA,PARQUE INTER.AMIS	¢24.162.412,50	22.722.412,50		1.440.000,00	9,00
6-03 275	(ENT.C.27)SAN ISIDRO FCA. IDA	¢7.469.156,25	7.469.156,25		-	3,00
6-03 256	(ENT.C.27) BAJO SABALO (ENT.C.27) ALTO SABALO	¢13.830.862,50	13.830.862,50		-	5,85
6-03 046	(ENT.C.27) EL CARMEN-BIO (ENT.C.37) COLORADO-BIOLLE	¢6.408.312,50	6.408.312,50		-	2,30
6-03 280	(ENT.C.46) EL CAMPO FCA. LOS SAENZ	¢3.689.900,00	3.689.900,00		-	0,80
6-03 265	(ENT.C.27)ALTO SABALO (ENT.C.46) EL CAMPO	¢7.607.437,50	7.607.437,50		-	1,50
6-03 272	(ENT.C.27) EL CARMEN ALTO PEDRO SANCHEZ	¢2.880.250,00	2.880.250,00		-	0,50
6-03 305	CALLES URBANAS - CUADR EL CARMEN, BIOLLEY	¢5.455.425,00	5.455.425,00		-	1,30
6-03 261	(ENT.C.256) BELLA VISTA (ENT.C.256) BELLA VISTA	¢6.679.425,00	6.679.425,00		-	3,00





Municipalidad de Buenos Aires  
Junta Vial Cantonal  
Departamento de Gestión Vial  
Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

		Mantenimiento Periódico del Distrito de Pilas		€110.550.117,84					
6-03	003	(ENT.N.625)TERRABA BJA-	(ENT.C.17) LAS DELICIAS,LMTE	€66.308.000,00	66.308.000,00			0,00	34,20
6-03	001	ENT.C.166)STA.CECILIA-DIB	(ENT.C.3)OJO AGUA CRUCE DA	€2.960.000,00	2.960.000,00			-	4,00
6-03	414	(ENT. C3) CONCEPCION	(ENT C3) PILAS, FINCA BATISTA	€2.368.000,00	2.368.000,00			-	3,20
6-03	001	ENT.C.166)STA.CECILIA-DIB	(ENT.C.3)OJO AGUA CRUCE DA	€13.295.000,00	€0,00	13.295.000,00		-	5,00
6-03	396	(ENT.C. 3 ) BIJAGUAL	CEMENTERIO DE BIJAGUAL	€5.495.000,00	€0,00	5.495.000,00		-	1,00
6-03	410	(ENT.C17) SAN VICENTE	(FIN CAMINO) BAJOS LOS FERN	€9.603.200,00	€0,00	9.603.200,00		-	3,90
6-03	413	(ENT. C17) PUEBLO NUEVO	(ENT. C 3) CONCEPCION	€10.520.917,84	€0,00	10.520.917,84		-	2,00
		Mantenimiento Periódico del Distrito de Colinas		€33.207.765,00					
6-03	052	(ENT.N.625)OJO DE AGUA.	MIRAVALLS, FILA PALMITAL	€11.483.500,00	11.483.500,00			-	3,50
6-03	028	(ENT.C.52) CRUCE A OJO D	MAYAL QUEBRADA HONDA	€5.564.175,00	5.564.175,00			-	1,50
6-03	053	(ENT.N.625)EL MAIZ DE BOR	EL CEDRAL	€10.023.140,00	10.023.140,00			-	4,00
6-03	054	(ENT.N.625) LOS ANGELES	(ENT.C.78) FILADELFIA	€6.136.950,00	6.136.950,00			-	2,40
<b>TOTAL DE KMS</b>				<b>904.586.121,72</b>	<b>553.460.855,01</b>	<b>255.911.985,52</b>	<b>95.213.281,19</b>		<b>408,18</b>

### Proyectos de pasos de Alcantarillas

CAMINO	NOMBRE		MONTO	EJECUCIÓN	COMPROMISOS	SALDO PRES	Pasos	
<b>Sistemas de Drenaje (Pasos) del Distrito de Brunca</b>			<b>€68.000.000,00</b>					
6-03	039	(ENT.N.2) CEIBO. FCA.SAUL CERDAS	€10.700.000,00	€10.620.476,16	€0,00	€79.523,84	4,00	
6-03	150	(ENT.N.610) CAÑAS (ENT.N.610) SOCORRO	€3.000.000,00	€2.681.934,71	€0,00	€318.065,29	1,00	
6-03	160	(ENT.C.150) SOCORRO FCA. JORGE NUÑEZ	€2.300.000,00	€2.263.726,24	€0,00	€36.273,76	1,00	
6-03	140	(ENT.C.10) SANTA ROSA FCA. OTTON ROMERO	€2.300.000,00	€2.219.495,32	€0,00	€80.504,68	1,00	
6-03	142	(ENT.C.10) SANTA ROSA FCA. ISRAEL VARGAS	€14.971.000,00	€14.669.077,10	€0,00	€301.922,90	5,00	
6-03	141	(ENT.C.10) SANTA ROSA (ENT.C.143) SANTA ROSA	€5.000.000,00	€4.952.899,90	€0,00	€47.100,10	2,00	
6-03	033	(ENT.N.2)CRUCE STA. MART	PARQUE INTERNACIONAL AMIS	€6.000.000,00	€5.580.235,78	€0,00	€419.764,22	2,00
6-03	018	(ENT.C.10) CRUCE STA.ROS	FILA STA. MARIA	€15.729.000,00	€15.728.967,08	€0,00	€32,92	4,00
6-03	019	(ENT.N.2)SANTA MARTA.	(ENT.C.35)CRUCE AL SOCORR	€5.000.000,00	€0,00	€3.780.337,80	€1.219.662,20	1,00
6-03	165	CALLES URBANAS - CUADR	SANTA MARTA DE BRUNCA	€3.000.000,00	€0,00	€2.997.099,82	€2.900,18	1,00
<b>Sistemas de Drenaje (Pasos) del Distrito de Biolley</b>			<b>€40.780.000,00</b>					
6-03	027	N.237)GUACIMO,TABLAS,RIG	ALTO SABALO(ENT.C.37) ALTAN	€6.678.985,00	€6.678.983,00	€0,00	€2,00	2,00
6-03	256	(ENT.C.27) BAJO SABALO	(ENT.C.27) ALTO SABALO	€11.321.015,00	€10.250.829,00	€0,00	€1.070.186,00	4,00
6-03	289	(ENT.C.286) BIOLLEY	TAJO FCA. LUIS FERNANDEZ	€4.780.000,00	€0,00	€4.273.709,82	€506.290,18	1,00
6-03	283	(ENT.C.46)EL CAMPO	(ENT.C.27) EL CARMEN	€0,00	€0,00	€0,00		
6-03	286	(ENT.C.48) LA PUNA	(ENT.C.37 Y 51) BIOLLEY- AYA	€5.290.000,00	€0,00	€5.139.788,85	€150.211,15	2,00
6-03	037	(ENT.C.282)BIOLLEY,COLOF	ALTAMIRA,PARQUE INTER.AMIS	€3.710.000,00	€0,00			
6-03	037	(ENT.C.282)BIOLLEY,COLOF	ALTAMIRA,PARQUE INTER.AMIS	€3.000.000,00	€0,00	€6.585.539,25	€124.460,75	2,00
6-03	290	(ENT.C.289) BIOLLEY	PARQUE INTER. LA AMISTAD	€6.000.000,00	€0,00	€6.000.000,00	€0,00	2,00
<b>Sistemas de Drenaje (Pasos) del Distrito de Volcan</b>			<b>€26.500.000,00</b>					
6-03	024	ENT.N.2)CRUCE TARICE	(ENT.C.23)CRUCE CORDONCII	€3.000.000,00	€2.424.980,08	€0,00	€575.019,92	1,00
6-03	059	(ENT.N.2)CONVENTO.	PUENTE RIO CONVENTO LMTE	€3.000.000,00	€2.718.934,02	€0,00	€281.065,98	1,00
6-03	112	(ENT.C.23) ALTAMIRA	RIO CONVENTO LMTE.CANTON	€15.000.000,00	€13.086.044,51	€0,00	€1.913.955,49	5,00
6-03	134	CALLES URBANAS - CUADR	URB. EL PEREGRINO	€5.500.000,00	€0,00	€5.440.400,64	€59.599,36	2,00
<b>Sistemas de Drenaje (Pasos) del Distrito de Colias</b>			<b>€38.349.111,47</b>					
6-03	062	(ENT.N.625) MAIZ DE BORUG	STA. MARTA,FILA MASTATAL	€23.142.815,41	€22.781.126,98	€0,00	€361.688,43	8,00
6-03	055	(ENT.N.625)BAJO EL MAIZ	(ENT.C.78)COLINAS	€15.206.296,06	€15.206.296,06	€0,00	€0,00	4,00
<b>Sistemas de Drenaje (Pasos) del Distrito de Potrero Grande</b>			<b>€22.725.000,00</b>					
6-03	045	(ENT.C.9) ALTO LA CRUZ	(ENT.C.218) EL TREBOL	€6.000.000,00	€5.488.416,94	€0,00	€511.583,06	1,00
6-03	045	(ENT.C.9) ALTO LA CRUZ	(ENT.C.218) EL TREBOL	€6.225.000,00	€0,00	€5.905.606,38	€319.393,62	1,00
6-03	009	(ENT.N.237) POTRERO GRA	PUEBLO NUEVO-FCA. HELECH	€3.000.000,00	€0,00	€2.990.151,61	€9.848,39	1,00
6-03	238	(ENT.N.2) CATARATAS	(ENT.237) IGLESIA TERRABA	€7.500.000,00	€0,00	€7.196.779,19	€303.220,81	3,00
<b>Sistemas de Drenaje (Pasos) del Distrito de Buenos Aires</b>			<b>€27.863.690,00</b>					
6-03	368	(ENT.C.49) YERI,PLAZA	ESCUELA RIO AZUL,RES.INDIG	€14.968.490,00	€14.133.544,00	€0,00	€834.946,00	6,00
6-03	323	(ENT.N.2) EL BRUJO	(ENT.C.373) MACHO MONTES	€12.895.200,00	€12.895.157,63	€0,00	€42,37	5,00
<b>Sistemas de Drenaje (Pasos) del Distrito de Boruca</b>			<b>€18.225.000,00</b>					
6-03	312	CALLES URBANAS - CUADR	POBLACION BORUCA	€6.000.000,00	€0,00	€5.665.768,74	€334.231,26	2,00
6-03	309	CALLES URBANAS - CUADR	CURRE	€6.000.000,00	€0,00	€5.796.855,58	€203.144,42	2,00
6-03	056	(ENT.N.625)ALTO SAN JOAQ	(ENT.C.312) BORUCA	€6.225.000,00	€0,00	€6.225.000,00	€0,00	1,00
<b>Sistemas de Drenaje (Pasos) del Distrito de Changuena</b>			<b>€6.250.000,00</b>					
6-03	377	(ENT.C.379) SABANA MAMEY	(ENT.C.379) ZAPOTAL	€6.250.000,00	€0,00	€6.250.000,00	€0,00	2,00
<b>TOTAL DE KMS</b>			<b>248.692.801,47</b>	<b>164.381.124,51</b>	<b>74.247.037,68</b>	<b>10.064.639,28</b>		<b>80,00</b>





### Alcantarillas de Cuadro

CAMINO	NOMBRE		MONTO	EJECUCIÓN	COMPROMISOS	SALDO PRES	Proyectos
	Sistemas de Drenaje (Alcantarilla) del Distrito de Volcan		¢39.950.000,00				
6-03	118	(ENT.C.23) CORDONCILLO   FCA. LOS VALVERDE	¢39.950.000,00	¢31.875.546,37	¢8.074.453,63	¢0,00	1,00
	Sistemas de Drenaje (Alcantarilla) del Distrito de Colinas		¢34.650.888,53				
6-03	053	(ENT.N.625)EL MAIZ DE BOR   EL CEDRAL	¢34.650.888,53	¢34.650.888,53	¢0,00	¢0,00	1,00
	Sistemas de Drenaje (Alcantarilla) del Distrito de Potrero Grande		¢27.636.310,00				
6-03	400	( ENT.C. 36 ) JORON   FINCA MANUEL BARRANTES	¢27.636.310,00	¢27.636.309,39	¢0,00	¢0,61	1,00
	Sistemas de Drenaje (Alcantarilla) del Distrito de Changuena		¢30.000.000,00				
6-03	422	(ENT. C 421) SLTO LA UNIÓN   (ENT. C 421) RÍO LIMONCITO	¢30.000.000,00	¢0,00	¢29.972.266,22	¢27.733,78	1,00
	Sistemas de Drenaje (Alcantarilla) del Distrito de Buenos Aires		¢33.000.000,00				
6-03	038	CALLES URBANAS - CUADR   BUENOS AIRES,PUNTARENAS.	¢33.000.000,00	¢0,00	¢32.995.015,34	¢4.984,66	1,00
TOTAL DE KMS			¢165.237.198,53	94.162.744,29	71.041.735,19	32.719,05	5,00

### Proyectos de Red Pluvial

CAMINO	NOMBRE		MONTO	EJECUCIÓN	COMPROMISOS	SALDO PRES	Proyectos
	Alcantarillado Pluvial del Distrito de Potrero Grande		¢61.606.433,96				
6-03	031	CALLES URBANAS - CUADR   POTRERO GRANDE, BUENOS A	¢61.606.433,96	¢61.406.433,96	¢0,00	¢200.000,00	1,00
	Alcantarillado Pluvial del Distrito de Buenos Aires		¢202.000.000,00				
6-03	038	CALLES URBANAS - CUADR   POLIDEPORTIVO	¢35.000.000,00	¢34.922.306,21	¢0,00	¢77.693,79	1,00
6-03	038	CALLES URBANAS - CUADR   CANTA RANA	¢122.000.000,00	¢121.557.736,40	¢0,00	¢442.263,60	1,00
6-03	038	CALLES URBANAS - CUADR   LAS ROSAS	¢45.000.000,00	¢44.498.882,69	¢0,00	¢501.117,31	1,00
TOTALES			¢263.606.433,96	262.385.359,26	-	1.221.074,70	4,00

### Cunetas Revestidas

CAMINO	NOMBRE		MONTO	EJECUCIÓN	COMPROMISOS	SALDO PRES	M2
	Cuneta Revestida del Distrito de Volcán		¢12.000.000,00				
6-03	074	(ENT.N.2)PEJE.   (ENT.N.610) VOLCAN	¢12.000.000,00	¢11.999.219,39	¢0,00	¢780,61	287,00
TOTALES			¢12.000.000,00	¢11.999.219,39	¢0,00	780,61	287,00

### Aceras

CAMINO	NOMBRE		MONTO	EJECUCIÓN	COMPROMISOS	SALDO PRES	ML
	Aceras del Distrito de Buenos Aires		¢67.754.095,65				
6-03	183	(ENT.N.2) SAN CARLOS   (ENT.C.26) SAN CARLOS	¢50.000.000,00	¢49.311.086,15	¢0,00	¢688.913,85	258,00
6-03	038	CALLES URBANAS - CUADR   ZONA ADMINISTRATIVA	¢17.754.095,65	¢13.913.453,99	¢0,00	¢3.840.641,66	132,00
	ACERAS Barrio los Mena		¢11.950.000,00				
6-03	038	CALLES URBANAS - CUADR   BUENOS AIRES,PUNTARENAS.	¢11.950.000,00	¢8.270.300,00	¢1.015.510,00	¢2.664.190,00	460,00
	ACERAS Costado el Parque		¢3.177.685,00				
6-03	038	CALLES URBANAS - CUADR   BUENOS AIRES,PUNTARENAS.	¢3.177.685,00	¢1.299.260,00	¢0,00	¢1.878.425,00	100,00
TOTALES			¢82.881.780,65	¢72.794.100,14	¢1.015.510,00	¢9.072.170,51	950,00





Municipalidad de Buenos Aires  
**Junta Vial Cantonal**  
 Departamento de Gestión Vial  
 Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

### TSB3

CAMINO	NOMBRE		MONTO	EJECUCIÓN	COMPROMISOS	SALDO PRES	M2
	Asfaltado del Distrito de Buenos Aires		¢60.320.000,00				
6-03	038	CALLES URBANAS - CUADR LAS ROSAS	¢53.820.000,00	¢46.728.648,67	¢0,00	¢7.091.351,33	3.900,00
6-03	038	CALLES URBANAS - CUADR ADENADA LAS ROSAS	¢6.500.000,00	¢6.499.625,62	¢0,00	¢374,38	576,00
TOTALES			¢60.320.000,00	¢53.228.274,29	¢0,00	7.091.725,71	4.476,00

### Asfaltados

CAMINO	NOMBRE		MONTO	EJECUCIÓN	COMPROMISOS	SALDO PRES	TON
	Asfaltado del Distrito de Changuena		¢58.754.150,00				
6-03	012	ENT.N.237)P.REAL,CHANG.S RIO LIMON,LMTE.CANTONAL S.	¢58.754.150,00	¢58.754.150,00	¢0,00	¢0,00	403,00
TOTALES			¢58.754.150,00	¢58.754.150,00		-	403,00

### Compra de materiales para puentes y alcantarillas

CAMINO	NOMBRE		MONTO	EJECUCIÓN	COMPROMISOS	SALDO PRES
	Puente la Quijada -Potrero 6-03-011		¢6.900.000,00			
6-03	011	ENT.C.31)POTRERO GDE.PI (ENT.C.27) BAJO SABALO	¢6.900.000,00	¢5.367.509,00	¢0,00	¢1.532.491,00
	Puente Colgante Peatonal camino 6-03-364 SAN VICENTE - C		¢2.128.000,00			
6-03	364	(ENT.C.80) SAN VICENTE   GUANACASTE,RESERVA INDIG	¢2.128.000,00	¢0,00	¢0,00	¢2.128.000,00
	Sistemas de Drenaje (Alcantarilla) del Distrito de Changuena		¢5.559.656.787,81			
6-03	012	ENT.N.237)P.REAL,CHANG.S RIO LIMON,LMTE.CANTONAL S.	¢18.723.700,00	¢3.939.399,00	¢7.042.350,00	¢7.741.951,00
TOTAL DE KMS			27.751.700,00	9.306.908,00	7.042.350,00	11.402.442,00





## 11. Anexos





## Anexos: REGISTRO FOTOGRÁFICO

### Proyectos por Administración

---

#### Proyecto:

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL en el **CAMINO 6-03-038 CALLES URBANAS - CUADRANTE. - BUENOSAIRES, PUNTARENAS** con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** ₡19 401 119,00

**Fecha de recibido del proyecto:** 18 de enero de 2020



#### Proyecto:

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL en el **CAMINO 6-03-002 (ENT.C.38) CRUCE SALITRE B. AIRES. - UJARRAZ, PLAZA DEPORTES** con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** ₡7, 737, 040,00

**Fecha de recibido del proyecto:** 15 de enero de 2021





Municipalidad de Buenos Aires  
Junta Vial Cantonal  
Departamento de Gestión Vial  
Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL en el **6-03-080 (ENT.C.2) PLAZA UJARRAS- FCA. ESPOSORIO ARAUZ.** con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** ₡20 723 192,00

**Fecha de recibido del proyecto:** 26 de enero de 2020



**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL en el camino **6-03-049 (ENT.C.2) BUENOS AIRES - (ENT.C.368) YERY-RESERV.INDIG.** con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** ₡8 210 396.00

**Fecha de recibido del proyecto:** 27 de enero de 2021





Municipalidad de Buenos Aires  
Junta Vial Cantonal  
Departamento de Gestión Vial  
Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL en el camino **6-03-368 (ENT.C.49) YERI, PLAZA – ESCUELA DE RIO AZUL.** con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** ₡17 318 400.00

**Fecha de recibido del proyecto:** 10 de febrero de 2021




**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO en el camino **6-03-012 (ENT.N.237)P.REAL-CHANG.SN.LUIS-RIO LIMON, LMTE.CANTONAL C. BRUS** con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** ₡1 203 152,00

**Fecha de recibido del proyecto:** 02 de febrero de 2020

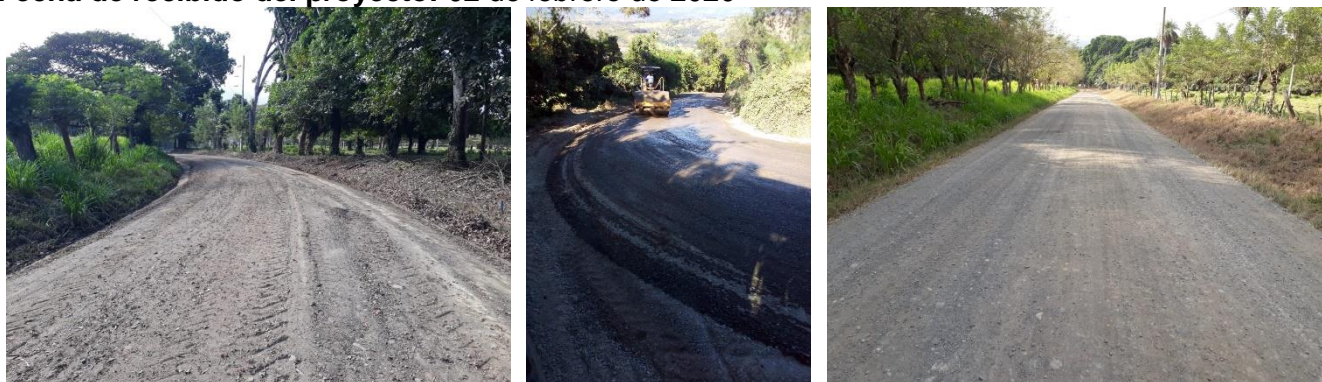



Municipalidad de Buenos Aires  
Junta Vial Cantonal  
Departamento de Gestión Vial  
Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL **camino 6-03-238 (ENT.N.2) CATARATAS - (ENT.C.237) IGLESIA DE TERRABA**. Con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** ₡19 002 102,00

**Fecha de recibido del proyecto:** 3 de marzo de 2021



**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL Camino **6-03-239 (ENT.C.237) IGLESIA TERRABA - CEM. TERRABA**. Con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** ₡3 038 934,00

**Fecha de recibido del proyecto:** 3 de marzo de 2021





Municipalidad de Buenos Aires  
Junta Vial Cantonal  
Departamento de Gestión Vial  
Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL camino **6-03-043 (ENT.N.237) LA PITA. - (ENT.C.304) ALTO GUACIMO**. Con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** ₡15 923 607,00

**Fecha de recibido del proyecto:** 10 de marzo de 2020



**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL camino **6-03-042 (ENT.N.237) GUACIMO - FCA.ELIECER CHACON-MONTELMAR**. Con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** ₡10 922 285,00

**Fecha de recibido del proyecto:** 16 de marzo de 2021





Municipalidad de Buenos Aires  
Junta Vial Cantonal  
Departamento de Gestión Vial  
Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL camino **6-03-021 (ENT.C.8,63) ALTO LAS BRISAS - (ENT.C.36) POTRERO GRANDE**. Con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** ₡15 450 440,00

**Fecha de recibido del proyecto:** 06 de mayo de 2021



**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL Camino **6-03-352 (ENT.C.63) BRISAS ABAJO - SANTA ELENA, RIO CABAGRA**. Con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** ₡44 945 816,00

**Fecha de recibido del proyecto:** 07 de julio de 2021





Municipalidad de Buenos Aires  
Junta Vial Cantonal  
Departamento de Gestión Vial  
Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL Camino **6-03-343 (ENT.C.63) SAN RAFAEL CAÑAS - FCA. JOSE ROJAS**. Con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** ₡6 140 015.00

**Fecha de recibido del proyecto:** 10 de agosto de 2021



**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL Camino **6-03-342 (ENT.C.63) SAN RAFAEL - LAS JUNTAS, RIO PIEDRA**. Con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** ₡ 10 998 006,00

**Fecha de recibido del proyecto:** 28 de julio de 2021





Municipalidad de Buenos Aires  
Junta Vial Cantonal  
Departamento de Gestión Vial  
Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL camino **6-03-332 (ENT.C.63) LAS BRISAS - FCA. SAUL CALDERON**. Con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** ₡281 275,00

**Fecha de recibido del proyecto:** 06 de mayo de 2021



**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL camino **6-03-063 (ENT.C.8 Y 21) BRISAS, SAN RAFAEL- (ENT.C.4) LA CAPRI**. Con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** ₡31 375 809,00

**Fecha de recibido del proyecto:** 27 de agosto de 2021





Municipalidad de Buenos Aires  
Junta Vial Cantonal  
Departamento de Gestión Vial  
Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL Camino **6-03-173 (ENT.N.610) BUENOS AIRES - (ENT.N.2) EL CEIBO**. Con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** ₡ 13 009 042,00

**Fecha de recibido del proyecto:** 21 de mayo de 2021



**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL Camino **6-03-005 (ENT.C.8) CRUCE STA.EDUVIJES - PARCELAS IDA**. Con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** ₡ 8 733 433,00

**Fecha de recibido del proyecto:** 22 de mayo de 2021





Municipalidad de Buenos Aires  
Junta Vial Cantonal  
Departamento de Gestión Vial  
Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL Camino **6-03-190 (ENT.N.2) CRUCE EL CEIBO - CARACOL CHIQUITO-RIO GENERAL**. Con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** \$23 901 752,00

**Fecha de recibido del proyecto:** 24 de junio de 2021



**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL Camino **6-03-011** Con recursos de la ley 8114 y 9329. Y partida específica para material.

**Monto Ejecutado:** 667 740

**Fecha de recibido del proyecto:** 06-006-2021





Municipalidad de Buenos Aires  
Junta Vial Cantonal  
Departamento de Gestión Vial  
Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Camino **6-03-029 PUENTE RIO LIMON, LIMITE CANT. - RESERVA INDIGENA GUAYMI**. Con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** ₡ 729 680,00

**Fecha de recibido del proyecto:** 15 de junio de 2021



**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL Camino **6-03-002 (ENT.C.38) CRUCE SALITRE B. AIRES. - UJARRAZ, PLAZA DEPORTES NERAL**. Con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** ₡ 4 265 475,00

**Fecha de recibido del proyecto:** 06 de Julio de 2021





Municipalidad de Buenos Aires  
Junta Vial Cantonal  
Departamento de Gestión Vial  
Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL Camino **6-03-031 CALLES URBANAS - CUADRANTE. - POTRERO GRANDE, BUENOS AIRES.** Con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** ₡14 670 387,00

**Fecha de recibido del proyecto:** 04 de agosto de 2021



**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL Camino **6-03-045** Con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado** ₡2 802 340,00

**Fecha de recibido del proyecto:** 13 de agosto de 2021






Municipalidad de Buenos Aires  
Junta Vial Cantonal  
Departamento de Gestión Vial  
Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL Camino **6-03-218** Con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** ₡3 372 285,00

**Fecha de recibido del proyecto:** 13 de agosto de 2021

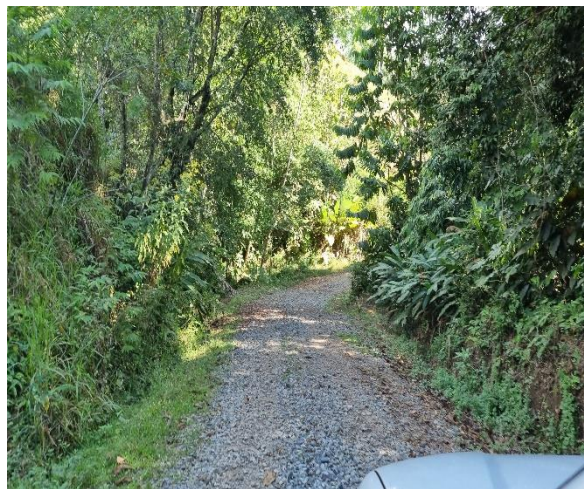

**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL Camino **6-03-017 (ENT.N.2) CRUCE PEJE - (ENT.C.3) CRUCE LAS BOLAS**. Con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** ₡3 357 180,00

**Fecha de recibido del proyecto:** 26 de agosto de 2021





Municipalidad de Buenos Aires  
Junta Vial Cantonal  
Departamento de Gestión Vial  
Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL CAMINO **6-03-108 CALLES URBANAS-CUADRANTES – POBLACIÓN PEJE- VOLCÁN**. Con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** ₡174 250.00

**Fecha de recibido del proyecto:** 26 de agosto de 2021



**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL CAMINO **6-03-073 ENT.N.610) VOLCAN - (ENT.N.2) CACAO**. Con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** ₡8 222 971.00

**Fecha de recibido del proyecto:** 07 de setiembre de 2021






Municipalidad de Buenos Aires  
Junta Vial Cantonal  
Departamento de Gestión Vial  
Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL CAMINO **6-03-006 (ENT. N.2) CONVENTO – TRES RIOS- FCA SANTA FE**. Con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** ₡5 096 417.00

**Fecha de recibido del proyecto:** 15 de setiembre de 2021

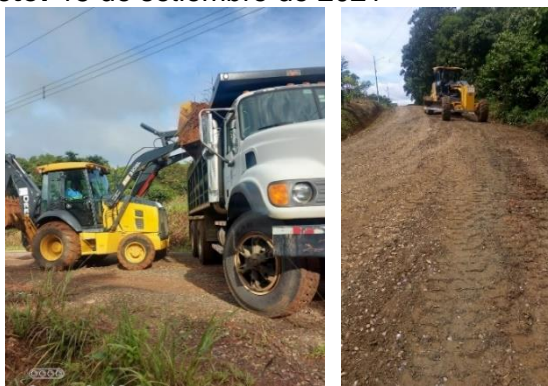

**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL CAMINO **6-03-013 (ENT.N.2) CRUCE CACAO, ESCUELA - (ENT.C.23) CRUCE CORDONCILLO**. Con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** ₡15 987 994.00

**Fecha de recibido del proyecto:** 14 de setiembre de 2021





Municipalidad de Buenos Aires  
Junta Vial Cantonal  
Departamento de Gestión Vial  
Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL Camino **6-03-094** Con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** ₡4 575 007.00

**Fecha de recibido del proyecto:** 18 de noviembre de 2021



**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL CAMINO **6-03-092 (ENT.N.2) SONADOR - FCA. GERARDO CORRALES**. Con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** ₡2 784 500.00

**Fecha de recibido del proyecto:** 17 de setiembre de 2021





Municipalidad de Buenos Aires  
Junta Vial Cantonal  
Departamento de Gestión Vial  
Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL CAMINO 6-03-059 (ENT.N.2) CONVENTO.  
- PUEENTE RIO CONVENTO LMTE.CANT. Con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** ₡2 400 310.00

**Fecha de recibido del proyecto:** 18 de setiembre de 2021



**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL CAMINO 6-03-624 (ENT.N.2) CONVENTO.  
- PUEENTE RIO CONVENTO LMTE.CANT. Con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** ₡946 907.00

**Fecha de recibido del proyecto:** 22 de setiembre de 2021





Municipalidad de Buenos Aires  
Junta Vial Cantonal  
Departamento de Gestión Vial  
Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL CAMINO **6-03-024 (ENT.N.2) CRUCE TARICE- (ENT.C.23) CRUCE CORDONCILLO**. Con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** ₡15 407 522.00

**Fecha de recibido del proyecto:** 05 de octubre de 2021



**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL CAMINO **6-03-101 (ENT.N.2) CONVENTO - PLAZA DEP. CONVENTO**. Con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** ₡1 693 300.00

**Fecha de recibido del proyecto:** 28 de setiembre de 2021





Municipalidad de Buenos Aires  
**Junta Vial Cantonal**  
Departamento de Gestión Vial  
Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL CAMINO **6-03-093 (ENT.N.2) CONVENTO - FCA. ISIDRO MADRIGAL**. Con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** ₡757 790,00

**Fecha de recibido del proyecto:** 24 de setiembre de 2021



**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL CAMINO **6-03-112 (ENT.C.23) ALTAMIRA - RIO CONVENTO LMTE.CANTONAL**. Con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** ₡15 550 627.00

**Fecha de recibido del proyecto:** 21 de octubre de 2021





Municipalidad de Buenos Aires  
Junta Vial Cantonal  
Departamento de Gestión Vial  
Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL Camino **6-03-134** Con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** ₡2 233 730.00

**Fecha de recibido del proyecto:** 06 octubre de 2021



**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL CAMINO **6-03-023 (ENT.C.117) CUADRANTES VOLCAN - VOLCANCITO**. Con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** ₡19 381 065.00

**Fecha de recibido del proyecto:** 02 de noviembre de 2021





Municipalidad de Buenos Aires  
Junta Vial Cantonal  
Departamento de Gestión Vial  
Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL Camino **6-03-038** Con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** ₡18 872 813.00

**Fecha de recibido del proyecto:** 26 de noviembre de 2021



**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL CAMINO **6-03-091 CUADRANTE URBANO CEIBA - CUADRANTE URBANO CEIBA**. Con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** ₡2 405 700.00

**Fecha de recibido del proyecto:** 05 de noviembre de 2021





Municipalidad de Buenos Aires  
Junta Vial Cantonal  
Departamento de Gestión Vial  
Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL Camino **6-03-114** Con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** 1 674 600

**Fecha de recibido del proyecto:** 11 de diciembre de 2021



**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL Camino **6-03-115** Con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado:** ₡124 000,00

**Fecha de recibido del proyecto:** 04 de noviembre de 2021





Municipalidad de Buenos Aires  
Junta Vial Cantonal  
Departamento de Gestión Vial  
Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL Camino **6-03-146** Con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado: ¢9 113 894.00**

**Fecha de recibido del proyecto: 08 de diciembre de 2021**



**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL Camino **6-03-158** Con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado: ¢ 1 741 670.00**

**Fecha de recibido del proyecto: 15 de diciembre de 2021**





Municipalidad de Buenos Aires  
Junta Vial Cantonal  
Departamento de Gestión Vial  
Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL Camino **6-03-012** Con recursos de la ley 8114 y 9329.

**Monto Ejecutado: ¢ 2 444 150**

**Fecha de recibido del proyecto:** 08 de diciembre de 2021



**Proyecto:**

LIMPIEZA MECANIZADA DE CUNETAS, ESPALDÓN, Y DERECHO DE VÍA, CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RUEDO, Y COLOCACIÓN DE MATERIAL Camino **6-03-737** Con recursos de la ley 8114 y 9329. pendiente

**Monto Ejecutado: ¢ 2 386 750**

**Fecha de recibido del proyecto:** 16 de diciembre de 2021





## Proyectos por Contratación

### Asfaltado

#### 1- PROYECTO SECTOR PASO REAL- CHANGUENA:

“CONTRATACIÓN POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS PARA: ASFALTADO EN EL CAMINO 6-03-012 SECTOR PASO REAL - CHANGUENA”.

**Licitación:** N° 2021LA-000009-0004200001

**Empresa Contratada:** QUEBRADORES DEL SUR DE COSTA RICA S.A.

**Monto total del Contrato Original:** ₡ 58.754.150,00

**Fecha de finalización del Proyecto:** 24 de junio de 2021.

**Fecha de elaboración del documento Pago Final:** 07 de julio de 2021





## Tratamiento Superficial Bituminoso (TSB3)

### 2- PROYECTO CALLES URBANAS B.A. SECTOR BARRIO LAS ROSAS:

“CONTRATACIÓN POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA COLOCACIÓN DE TSB3 EN EL CAMINO 6-03-038 CALLES URBANAS B.A. SECTOR BARRIO LAS ROSAS”.

**Licitación:** N° 2021LA-000008-0004200001

**Empresa Contratada:** QUEBRADORES DEL SUR DE COSTA RICA S.A.

**Monto total del Contrato Original y Adenda:** ₡53.228.274,29

**Fecha de finalización del Proyecto:** 11 de junio de 2021.

**Fecha de finalización de la Adenda:** 20 de agosto de 2021.

**Fecha de elaboración del documento Pago Final:** 06 de septiembre de 2021





## Mantenimiento Periódico

### 1-PROYECTO BORUCA:

“CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS 6-03-310, 6-03-312, 3-03-315, 6-03-057, 6-03-058 DEL DISTRITO DE BORUCA”.

**Licitación:** N° 2021LA-000007-0004200001.

**Empresa Contratada:** ALCAPRA ACP S.A.

**Monto total del Contrato Original:** ₡ 109.378.650,00

**Fecha de finalización del proyecto:** Pendiente.

**Fecha de elaboración del documento para Pago Final:** Pendiente.





Municipalidad de Buenos Aires  
Junta Vial Cantonal  
Departamento de Gestión Vial  
Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

**2-PROYECTO CHANGUENA:**

“CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS 6-03-022, 6-03-012, 6-03-379, 6-03-378, 6-03-050, 6-03-066, 6-03-087, 6-03-068 DEL DISTRITO DE CHANGUENA”.

**Licitación:** N° 2021LA-000006-0004200001.

**Empresa Contratada:** ALCAPRA ACP S.A.

**Monto total del Contrato Original:** ₺ 53.142.110,00

**Fecha de finalización del proyecto:** 21 de julio de 2021

**Fecha de elaboración del documento para Pago Final:** 20 de agosto de 2021





Municipalidad de Buenos Aires  
Junta Vial Cantonal  
Departamento de Gestión Vial  
Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

**3-PROYECTO BIOLLEY:**

“CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS 6-03-027, 6-03-037, 6-03-275, 6-03-256, 6-03046, 6-03-280, 6-03-265, 6-03-272 DEL DISTRITO DE BIOLLEY”.

**Licitación:** N° 2021LA-000003-0004200001

**Empresa Contratada:** ALCAPRA ACP S.A.

**Monto total del Contrato Original:** ₺ 114.535.415,86

**Fecha de finalización del Proyecto:** 07 de junio de 2021

**Fecha de elaboración del documento Pago Final:** 18 de junio de 2021





Municipalidad de Buenos Aires  
Junta Vial Cantonal  
Departamento de Gestión Vial  
Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

**4-PROYECTO PILAS:**

“CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS 6-03-003, 6-03-001 y 6-03-414 DEL DISTRITO DE PILAS”.

**Licitación:** N° 2021LA-000004-0004200001

**Empresa Contratada:** ALCAPRA ACP S.A.

**Monto total del Contrato Original:** ₡ 71.636.000,00

**Fecha de finalización del Proyecto:** 24 de junio de 2021

**Fecha de elaboración del documento Pago Final:** 09 de julio de 2021





Municipalidad de Buenos Aires  
Junta Vial Cantonal  
Departamento de Gestión Vial  
Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

**5-PROYECTO COLINAS:**

“CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS 6-03-052, 6-03-028, 6-03-053 Y 6-03-054 DEL DISTRITO DE COLINAS”.


**Licitación:** N° 2021LA-000005-0004200001.

**Empresa Contratada:** ALCAPRA ACP S.A.

**Monto total del Contrato Original:** ₺ 33.207.765,00

**Fecha de finalización del proyecto:** 07 de septiembre de 2021

**Fecha de elaboración del documento para Pago Final:** 07 de octubre de 2021

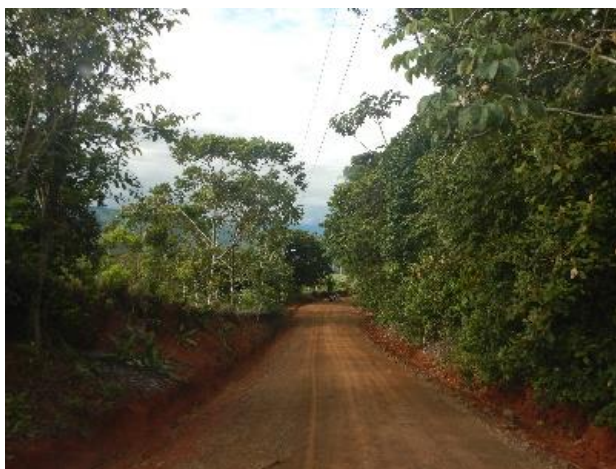



Municipalidad de Buenos Aires  
Junta Vial Cantonal  
Departamento de Gestión Vial  
Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

**6-PROYECTO PILAS II:**

“CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS 6-03-396, 6-03-001, 6-03-410, 6-03-413”.

**Licitación:** N° 2021LA-000020-0004200001.


**Empresa Contratada:** ALGRASA S.A.

**Monto total del Contrato Original:** ₡ 35.169.154,16

**Monto total de Adenda al contrato:** ₡3.744.963,68

**Fecha de finalización del proyecto:** 21 de enero de 2022.

**Fecha de elaboración del documento para Pago Final:** 27 de enero de 2022.

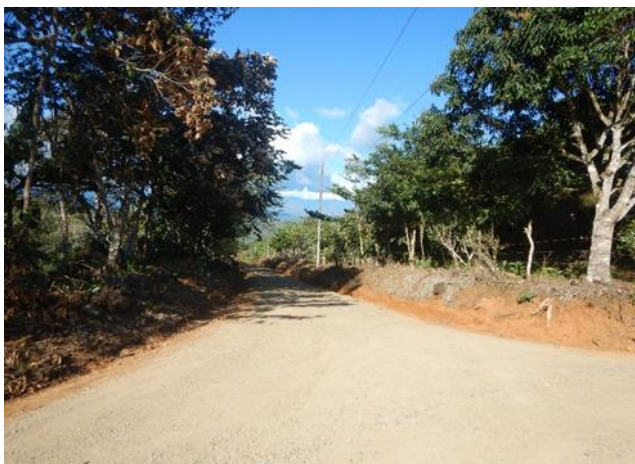



## Rehabilitación:

### 1-PROYECTO COLONO-ZONA ADMINISTRATIVA:

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN DE ACERA EN EL CAMINO 6-03-038 SECTOR COLONO-ZONA ADMINISTRATIVA”.

Licitación: N° 2021CD-000015-0004200001

Empresa Contratada: Constructora ALBASA

Monto Total del Contrato Original y Adenda: **₡ 17.698.847,46**

Fecha de finalización de las obras del proyecto: 22 de agosto de 2021.

Fecha de elaboración del documento de pago final: 30 de septiembre de 2021





Municipalidad de Buenos Aires  
Junta Vial Cantonal  
Departamento de Gestión Vial  
Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

**2-PROYECTO PEJE:**

“CONTRATACIÓN POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA REVESTIDA EN EL CAMINO 6-03-074”.

**Licitación:** N° 2021CD-000016-0004200001

**Empresa Contratada:** Constructora ALBASA

**Monto Total del Contrato Original:** ₡ 11.999.219,39

**Fecha de finalización de las obras del contrato original:** 27 de septiembre de 2021.

**Fecha de elaboración del documento de pago final:** 22 de octubre de 2021





Municipalidad de Buenos Aires  
Junta Vial Cantonal  
Departamento de Gestión Vial  
Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

**3-PROYECTO SAN CARLOS BUENOS AIRES:**

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y SISTEMA DE DRENAJE EN EL CAMINO 6-03-183 SAN CARLOS BUENOS AIRES”.

**Licitación:** N° 2021LA-000001-0004200001

**Empresa Contratada:** Constructora ALBASA

**Monto Total del Contrato Original:** ₺ 49.360.446,60

**Monto total de la ADENDA al contrato:** ₺611.278,33

**Fecha de finalización parcial de las obras del contrato:** 10 de mayo de 2021.

**Fecha de elaboración del documento de pago parcial:** 12 de mayo de 2021.

**Fecha de finalización total de las obras del contrato:** 24 de mayo de 2021

**Fecha de finalización total de las obras de la adenda:** 31 de mayo de 2021

**Fecha de elaboración del documento de pago final:** 03 de junio de 2021





Municipalidad de Buenos Aires  
Junta Vial Cantonal  
Departamento de Gestión Vial  
Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

**4-PROYECTO SECTOR LA TORRE -RUTA NACIONAL 246:**

“CONTRATACIÓN POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO 6-03-038, SECTOR LA TORRE -RUTA NACIONAL 246”.

**Licitación:** N° 2021LA-000002-0004200001

**Empresa Contratada:** Constructora ALBASA

**Monto Total del Contrato Original:** ₡ 121.557.736,40

**Fecha de finalización total de las obras del contrato:** 11 de junio de 2021.

**Fecha de elaboración del documento de pago final:** 18 de junio de 2021.





Municipalidad de Buenos Aires  
Junta Vial Cantonal  
Departamento de Gestión Vial  
Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

**5-PROYECTO BUENOS AIRES, POTRERO GRANDE Y BIOLLEY:**

“CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS 6-03-400,6-03-027, 6-03-256, 6-03-045, 6-03-368, 6-03-323 DISTRITO BUENOS AIRES, POTRERO GRANDE Y BIOLLEY”.

**Licitación:** N° 2021LA-000012-0004200001

**Empresa Contratada:** Constructora ALBASA

**Monto Total del Contrato Original:** ₡ 77.083.239,96

**Fecha de finalización de las obras del contrato:** 10 de septiembre de 2021.

**Fecha de elaboración del documento de pago final:** 30 de septiembre de 2021





**6-PROYECTO POLIDEPORTIVO-CENTRO:**

CONTRATACIÓN POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO 6-03-038 POLIDEPORTIVO, III ETAPA SECTOR POLIDEPORTIVO - CENTRO.

**Licitación:** N° 2021LA-000011-0004200001

**Empresa Contratada:** Constructora ALBASA

**Monto Total del Contrato Original:** ₡ 34.922.306,21

**Fecha de finalización total de la obra:** 04 de junio de 2021.

**Fecha de elaboración del documento:** 18 de junio de 2021





Municipalidad de Buenos Aires  
Junta Vial Cantonal  
Departamento de Gestión Vial  
Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

**7-PROYECTO BRUNKA Y VOLCÁN:**

“CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS 6-03- 118, 039, 150, 160, 140, 142, 141, 033, 018, 024, 059, 112 BRUNKA Y VOLCÁN”.

**Licitación:** N° 2021LA-000013-0004200001

**Empresa Contratada:** Constructora ALBASA

**Monto Total del Contrato Original y Adenda:** ₺108.822.317,27

**Fecha de finalización de las obras del proyecto:** 14 de septiembre de 2021.

**Fecha de elaboración del documento de pago final:** 30 de septiembre de 2021.





Municipalidad de Buenos Aires  
Junta Vial Cantonal  
Departamento de Gestión Vial  
Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

**8-PROYECTO BARRIO LAS ROSAS EN CALLES URBANAS – B.A:**

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN DE ACERA Y SISTEMA DE DRENAJE EN EL CAMINO 6-03-038 BARRIO LAS ROSAS EN CALLES URBANAS – B.A”.

**Licitación:** N° 2021LA-000014-0004200001

**Empresa Contratada:** Constructora ALBASA

**Monto Total del Contrato Original:** ₺ 44.498.882,69

**Fecha de finalización de las obras del proyecto:** 22 de octubre de 2021.

**Fecha de elaboración del documento de pago final:** 29 de octubre de 2021.





Municipalidad de Buenos Aires  
Junta Vial Cantonal  
Departamento de Gestión Vial  
Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

**9-PROYECTO COLINAS:**

“CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS 6-03-053, 6-03-062, 6-03-055 DEL DISTRITO DE COLINAS”.

**Licitación:** N° 2021LA-000015-0004200001

**Empresa Contratada:** Constructora ALBASA

**Monto Total del Contrato Original:** ₺ 72.638.311,56

**Fecha de finalización parcial de las obras del contrato:** 20 de septiembre de 2021.

**Fecha de elaboración del documento de pago parcial:** 30 de septiembre de 2021.

**Fecha de finalización total de las obras del contrato:** 30 de septiembre de 2021.

**Fecha de elaboración del documento de pago final:** 28 de octubre de 2021.





Municipalidad de Buenos Aires  
Junta Vial Cantonal  
Departamento de Gestión Vial  
Informe Anual - Rendición de Cuentas 2021

**10-PROYECTO CALLES URBANAS DE POTRERO GRANDE:**

“CONTRATACIÓN POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO 6-03-031 CALLES URBANAS DE POTRERO GRANDE”.

**Licitación:** N° 2021LA-000019-0004200001

**Empresa Contratada:** Constructora ALBASA

**Monto Total del Contrato Original:** ₡ 52.277.175,88

**Monto Total de Adenda:** ₡ 9.129.258,08

**Fecha de finalización parcial de las obras del contrato:** 28 de octubre de 2021

**Fecha de elaboración del documento de pago parcial:** 05 de noviembre 2021

**Fecha de finalización total de obras del contrato y adenda:** 02 de diciembre de 2021

**Fecha de elaboración del documento de pago final:** 08 de diciembre 2021

