



Junta Vial Cantonal

Informe Anual de Rendición de Cuentas 2024

Municipalidad de Buenos Aires




Agenda




1 Junta Vial Cantonal



2 Presupuesto y Planes de Trabajo



3 Caminos a intervenir según programación



4 Ejecución de recursos, según Metas POA



5 Resumen de evaluación del PAO 2024

6 Otros



Junta Vial Cantonal



Es un órgano público no estatal, nombrado por el Concejo Municipal ante quien responde por su gestión.

Asignación de recursos económicos.



Miembros Actuales de la JV



MSc. Ana Margoth Mora Navarro
Alcaldesa



Lic. Jessica Villanueva Sandí
Consejo Municipal




Sr. Marco Tulio Fallas Prado
Representante Sindicatos



Sr. Melvin Cordero Campos
Asociaciones de Desarrollo



Ing. MAE, David Salazar Aguilar
Coordinador Gestión Vial

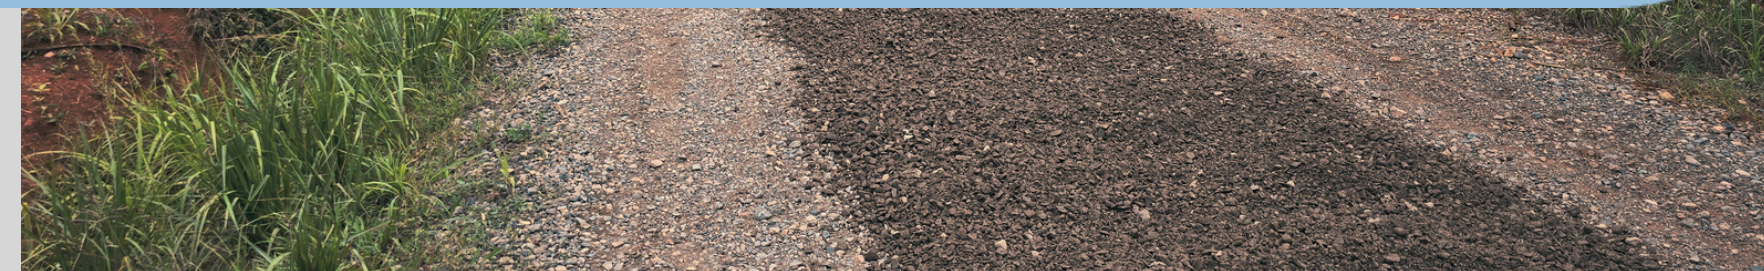

Presupuesto total

Recursos 8114 - 9329 y Préstamo IFAM.

Monto:


₡5.739.089.523,15

Recursos 2024
Ley 8114-9329
₡ 3.760.178.251,46

Recursos
préstamo IFAM
₡ 1.029.203.648,12

Liquidación 2022
Ley 8114-9329
₡ 63.470.141,86

Ejecución de recursos, según metas propuestas en PAO




Porcentaje de ejecución de metas
91.67%

Origen de los recursos	Presupuesto	Compromisos	Ejecución
Ley 8114- Ley 9329	¢4 489 714 523,15	¢1 366 114 160,92	¢2 781 765 975,69
Prestamo IFAM 2024	¢1 249 375 000,00	¢505 088 980,78	¢524 114 667,34
	¢5 739 089 523,15	¢1 871 203 141,70	¢3 305 880 643,03



Caminos intervenidos según programación

266 caminos para el 2024




190
(720,41 km)
Mantenimiento Periódico



65
Proyectos de Rehabilitación




3
Proyectos de Señalización

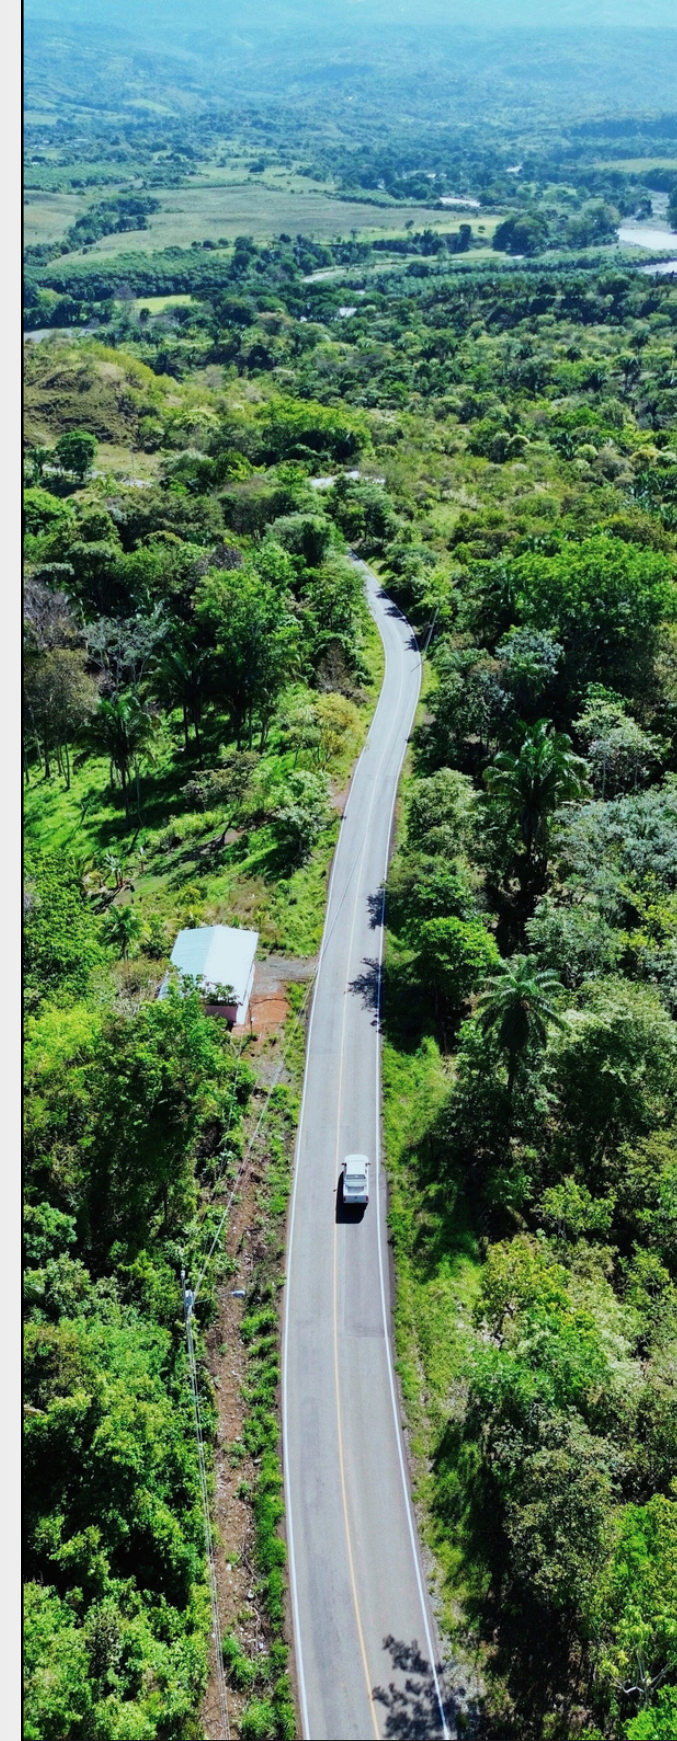


8
Proyectos de Mejoramiento

Proyectos de Mantenimiento por Administración

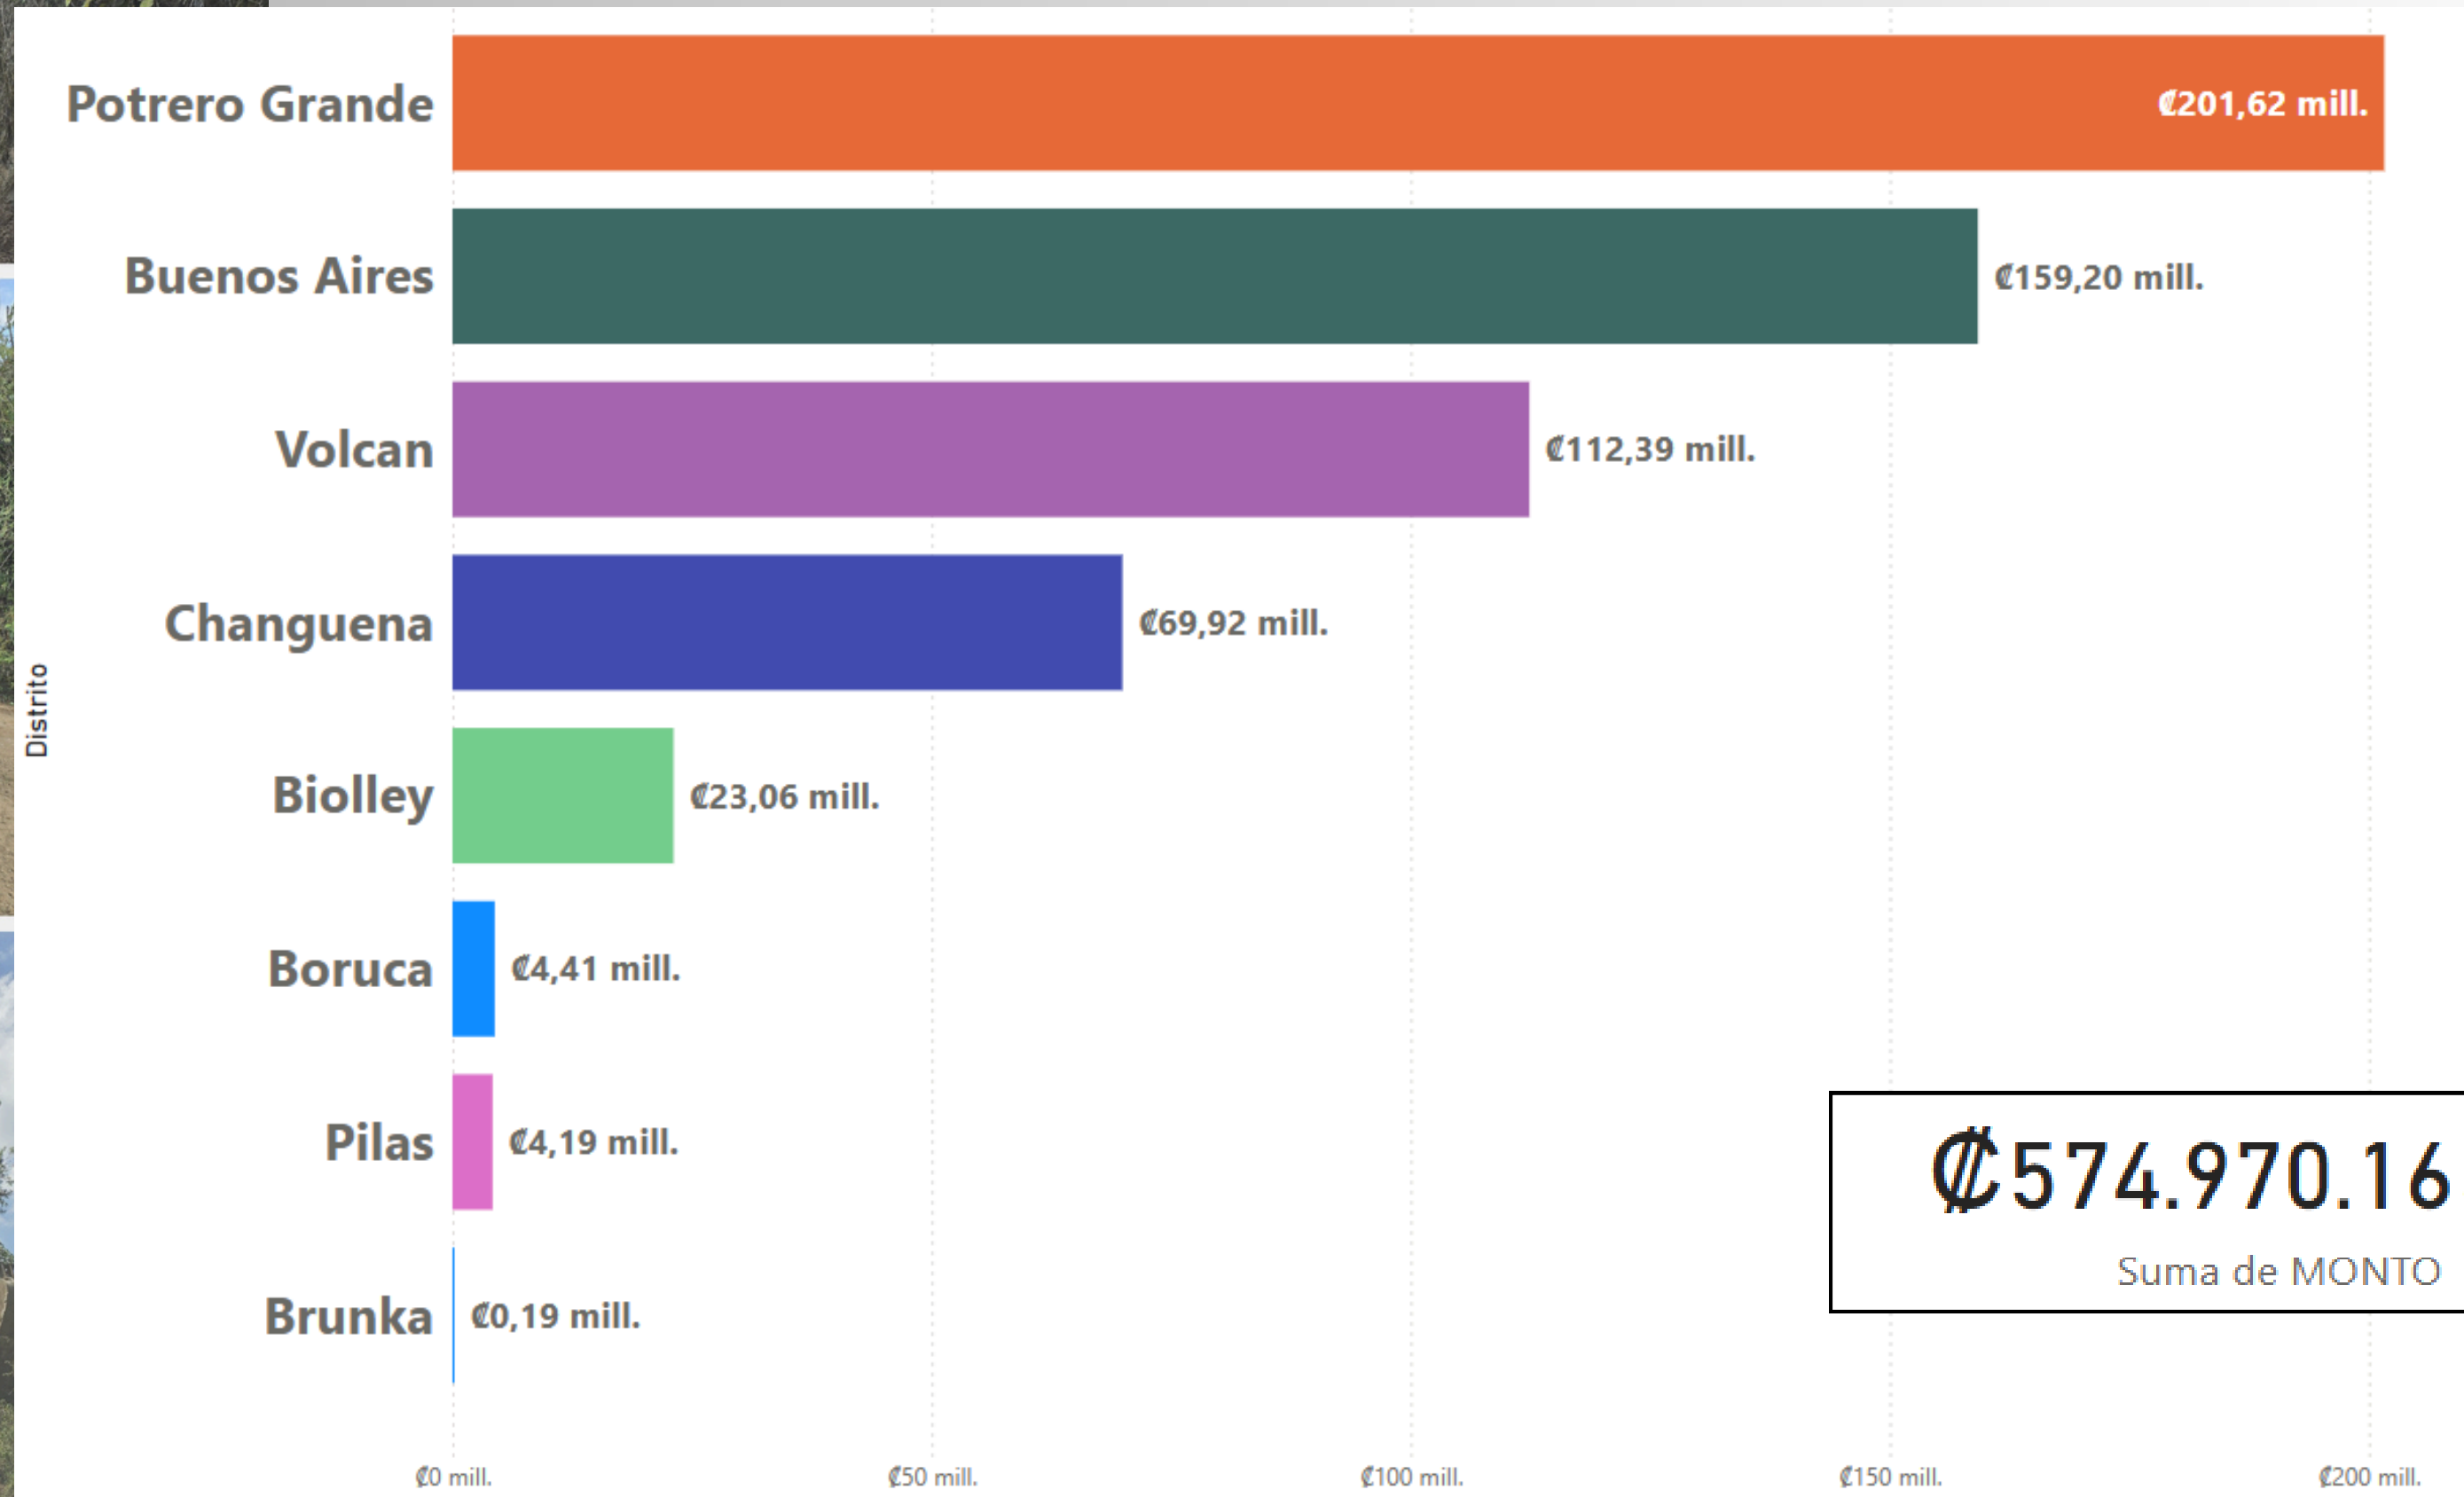

Proyectos de Mantenimiento por Contratación

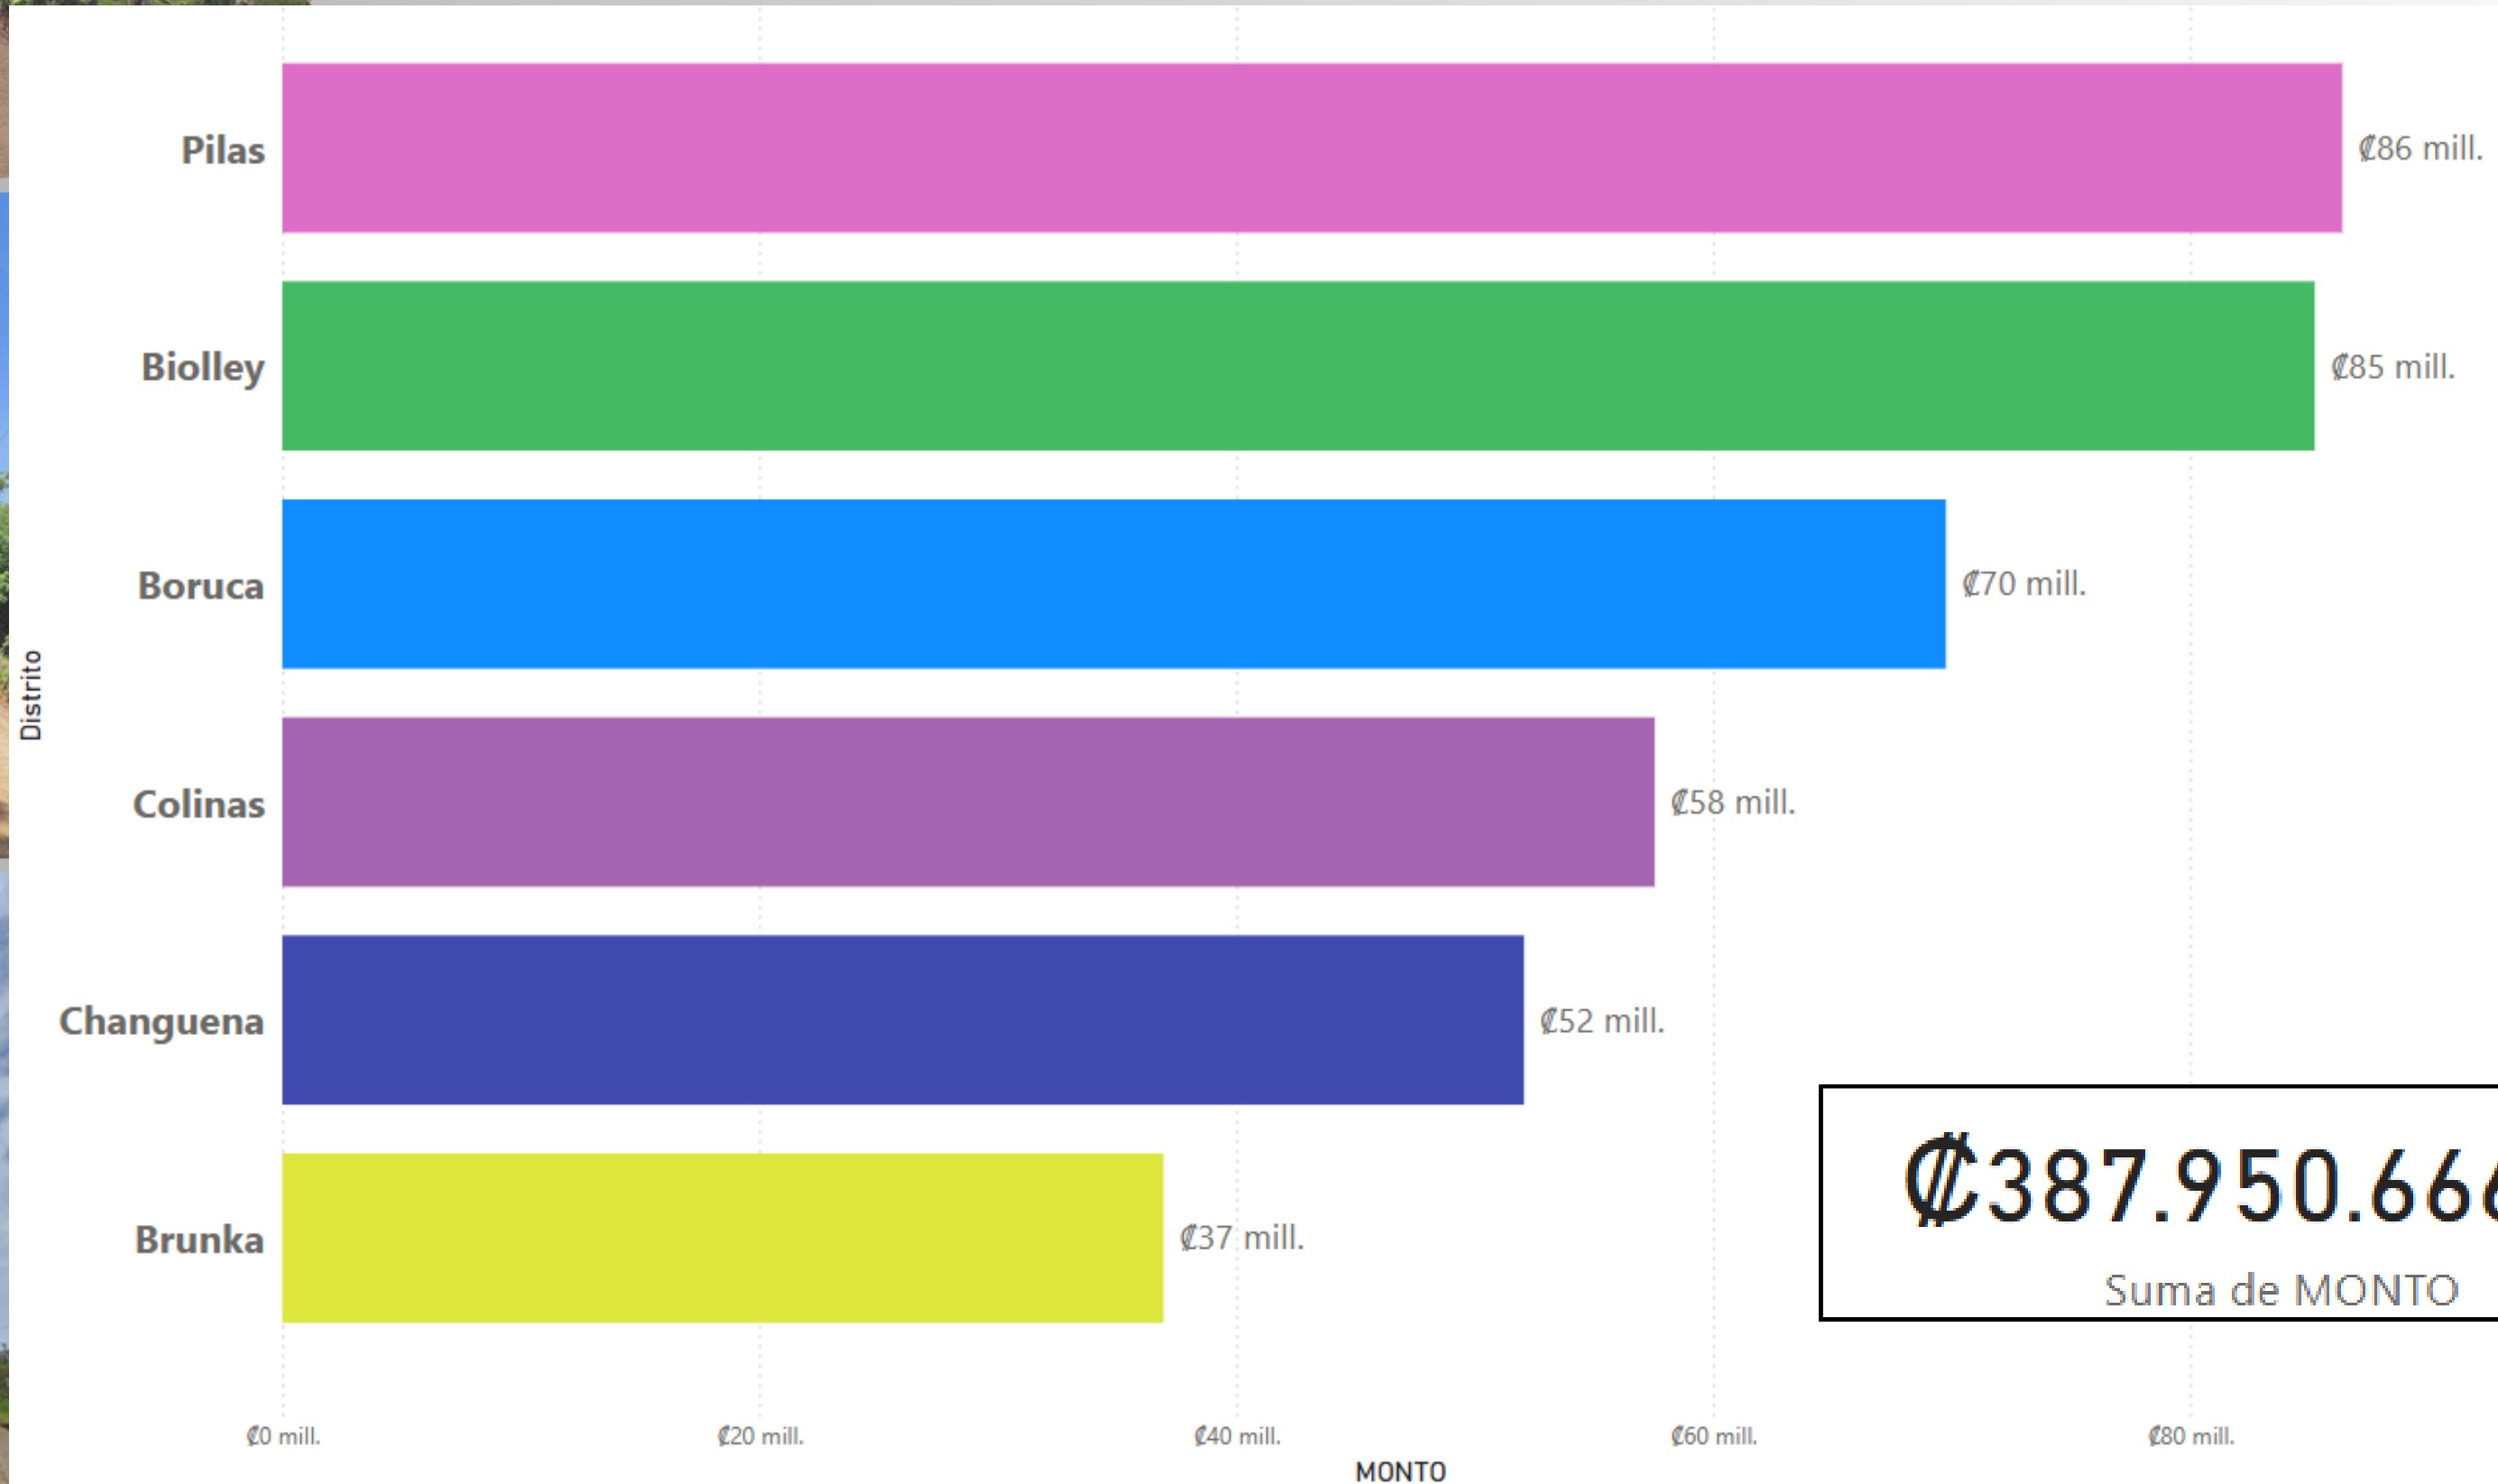


€387.950.666,79


Suma de MONTO




Proyectos de Rehabilitación por Contratación

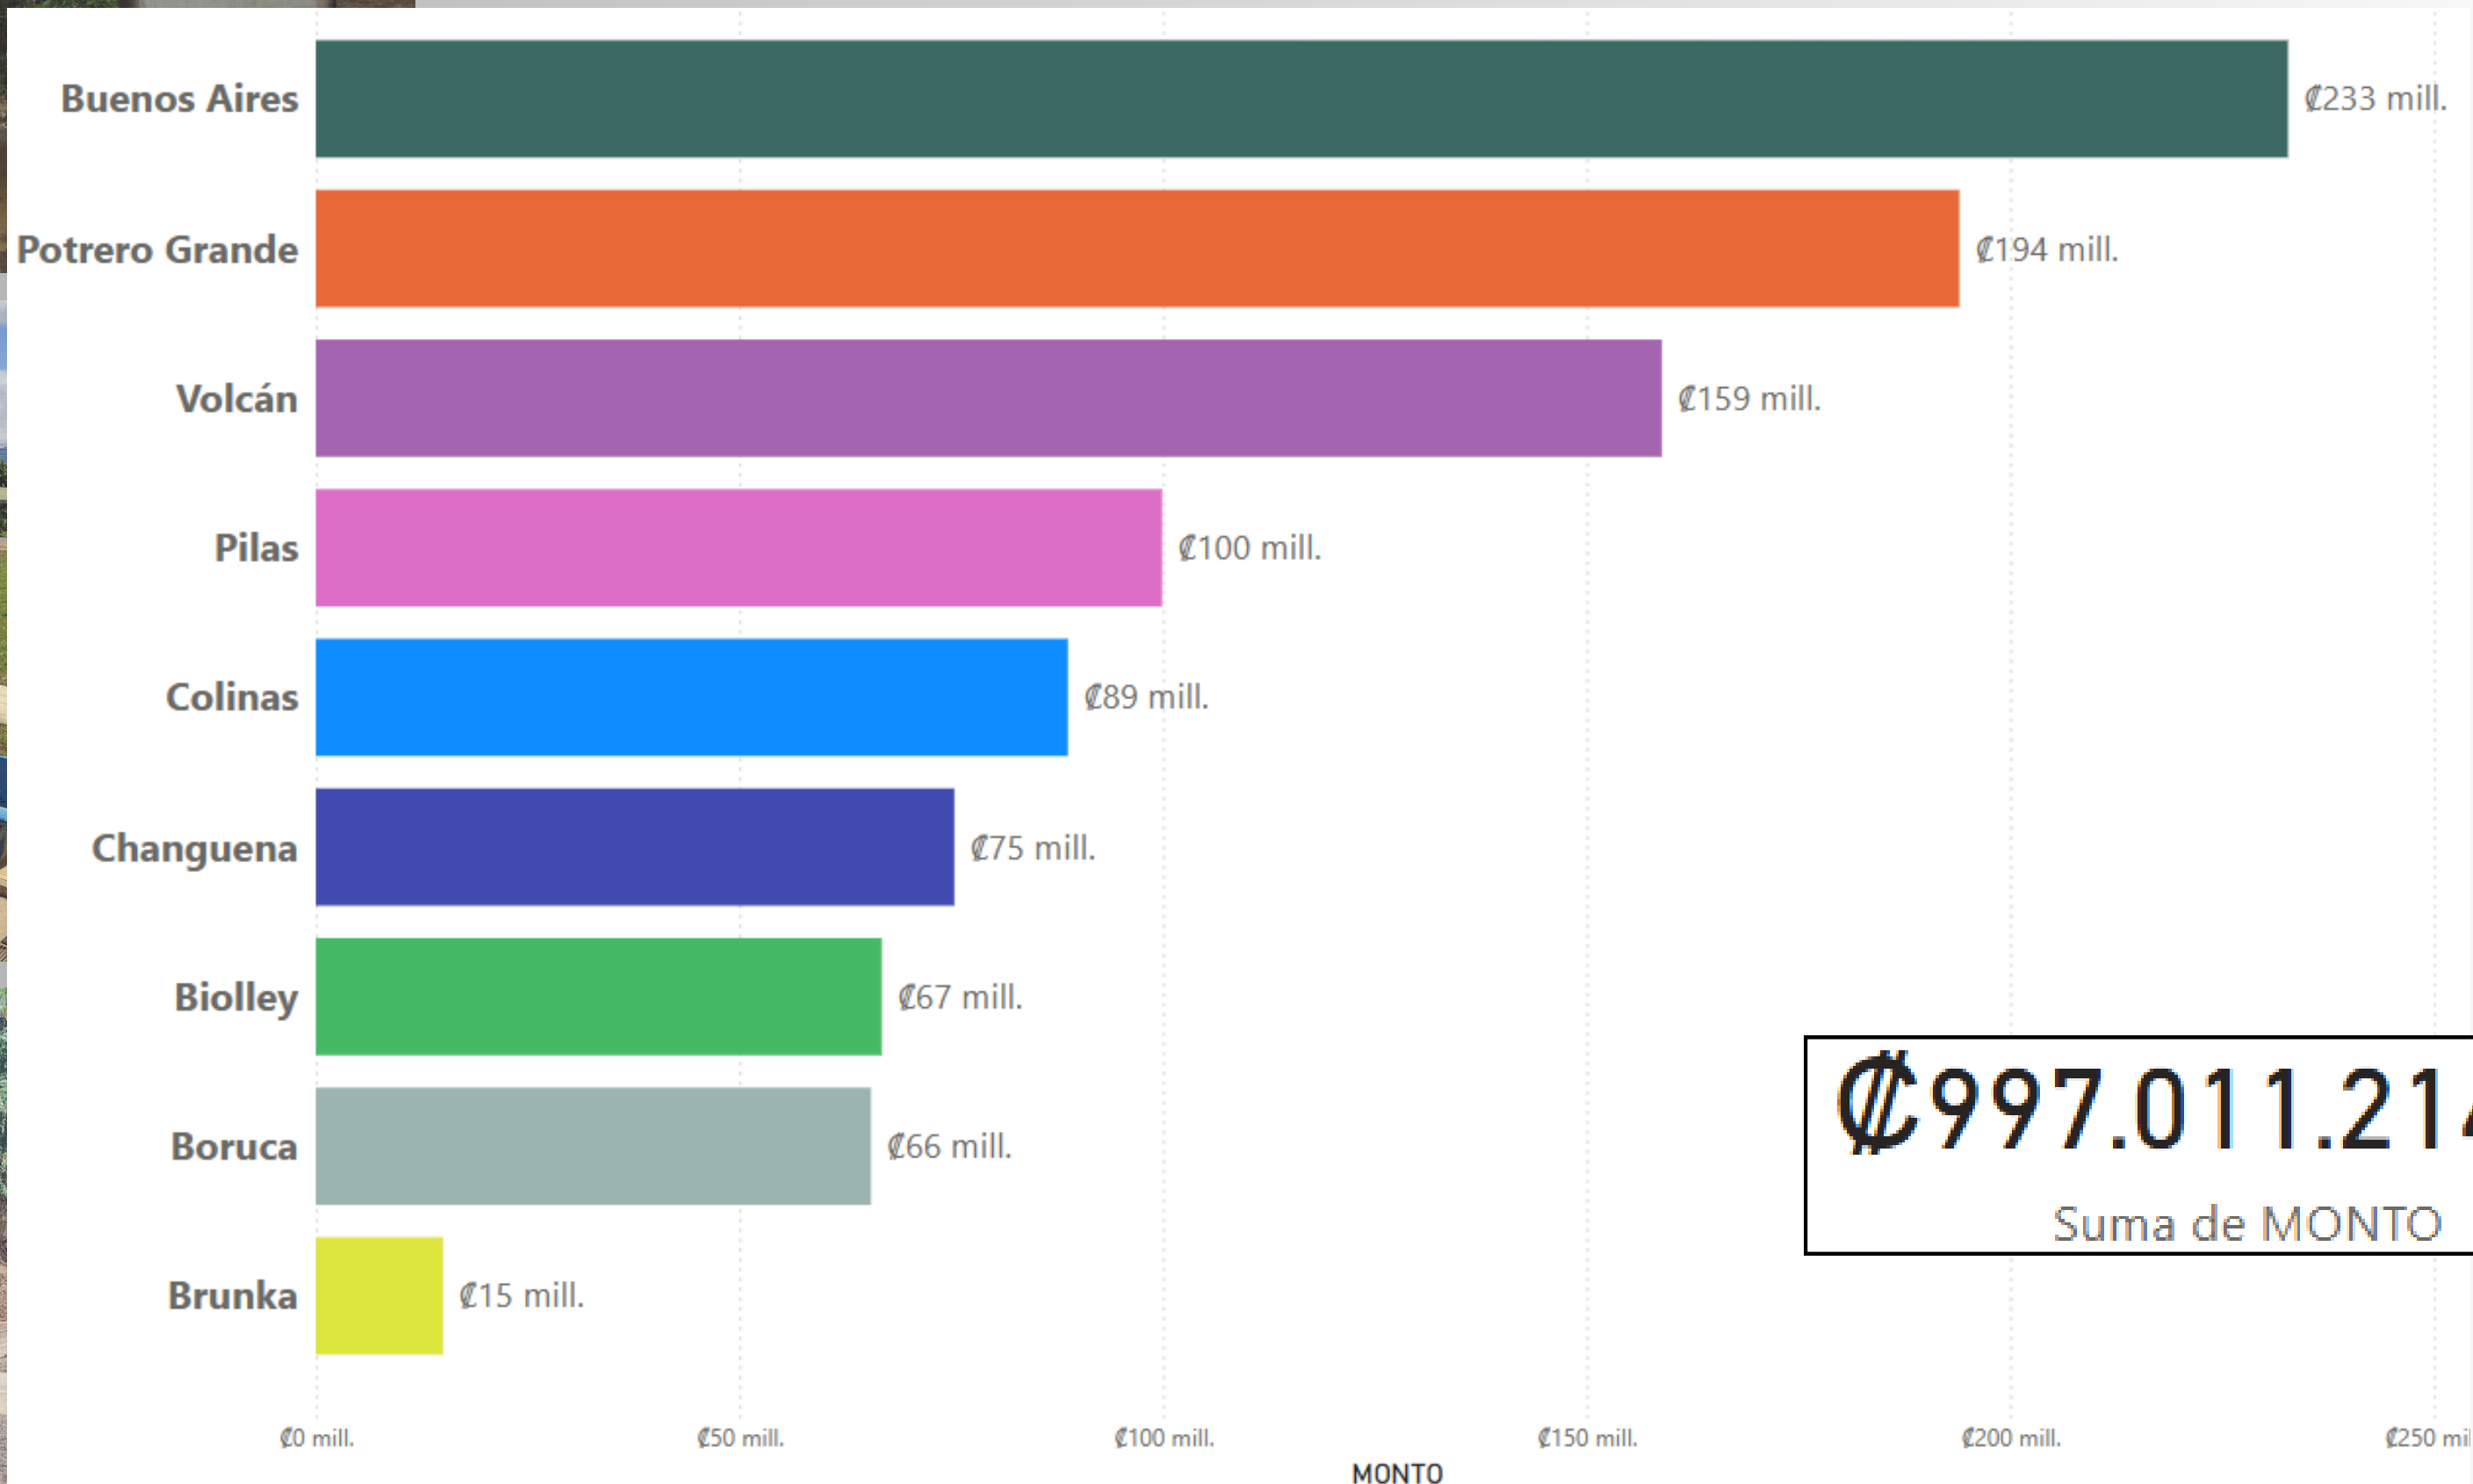

Proyectos de Asfaltado por Contratación

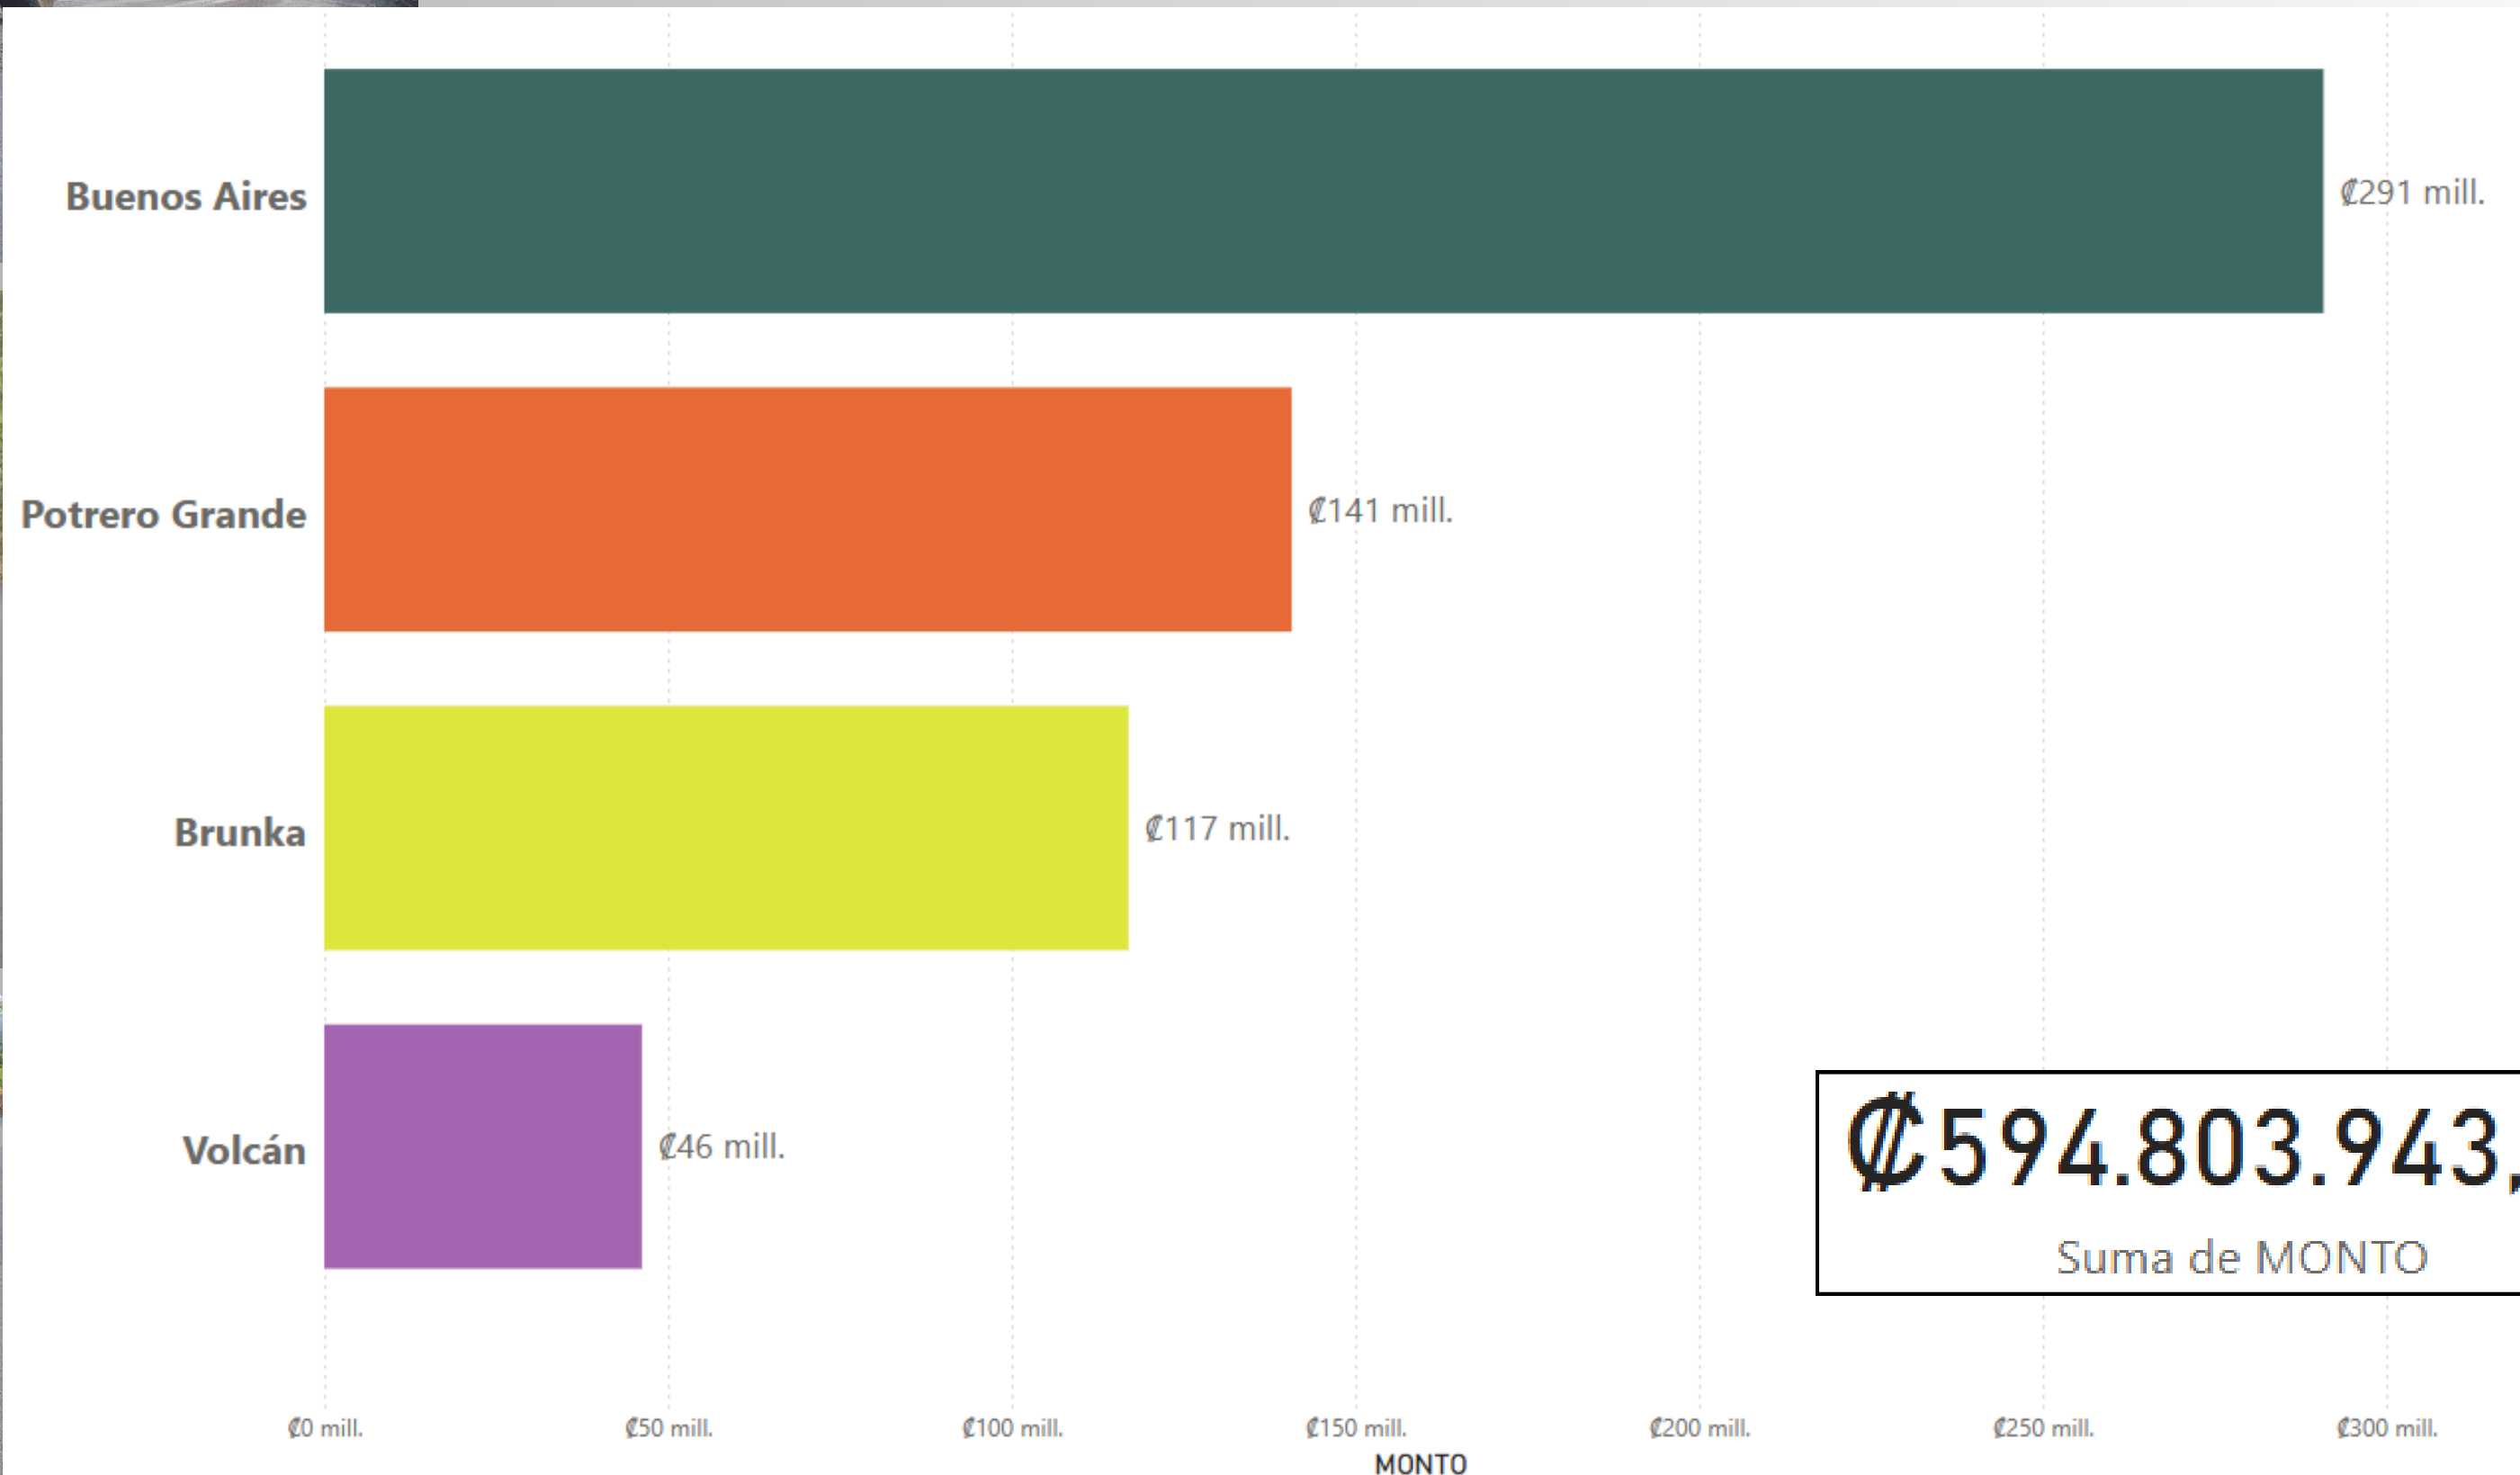

Proyectos de Señalización por Contratación

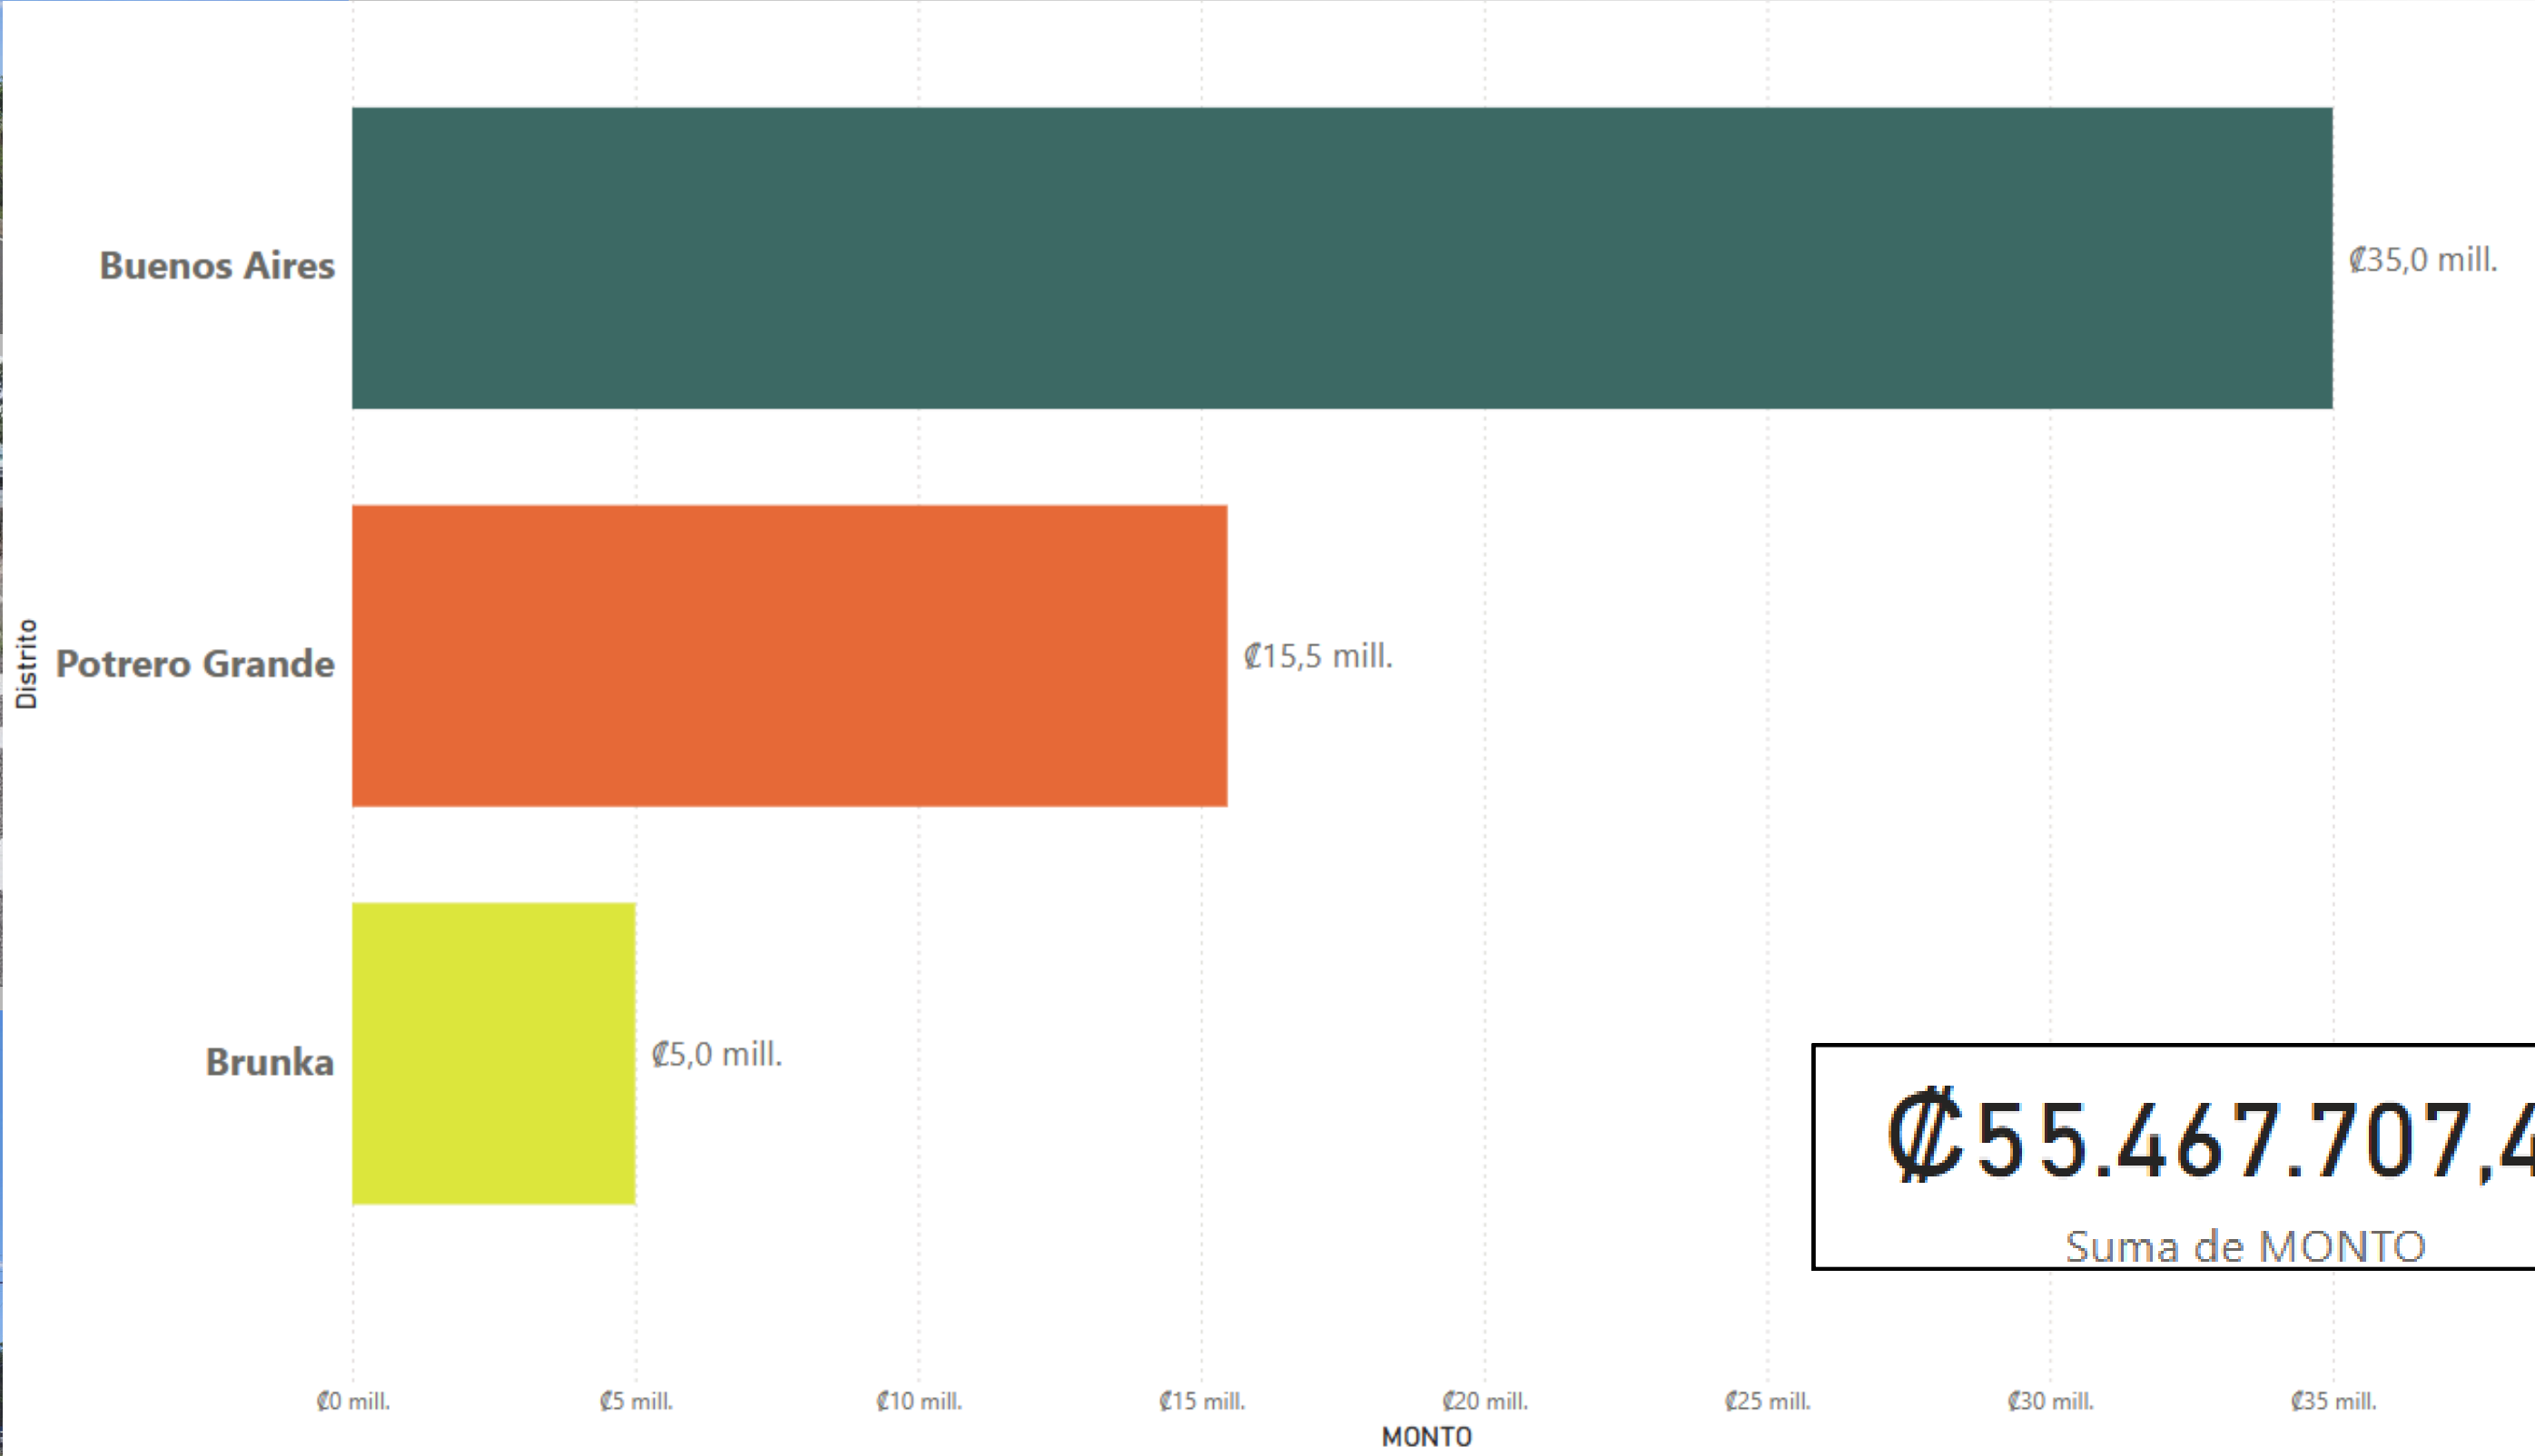



Ejec Inmediata

21 Casos

¢ 13.730.910,00



IFAM

Asfaltado y TSB3

¢768.235.789,14




MMEC

Distrito Biolley


¢89.768.794,06



Resumen de evaluación del POA 2024



N° Meta	Objetivo	% ejecución	Observaciones
1	Contar con el recurso humano necesario para la operación y administración de la Red Vial Cantonal	100%	Se logró superar la meta a 63 funcionarios, quedando un saldo debido a que no existieron aumentos salariales.
2	Dotar al proceso de gestión vial de recurso económico para mantener la operatividad de un departamento e infraestructura consolidada	79%	Se ejecutan ¢89.379.439,02 por lo que no se invierten la totalidad de los recursos, sin embargo, se cumplieron las necesidades del departamento, menos la remodelación de la bodega por condiciones externas.
3	Contar con el recurso para mantener la Flotilla vehuiclar en buen estado y al día para su circulación.	82%	Se ejecutan ¢283.089.652,37 dando el debido mantenimiento a la flotilla para su funcionamiento, quedando saldos en repuestos y lubricantes que no se requirieron por contar con algunas maquinas nuevas.
4	Contar los servicios profecionales necesarios que apoyen a la gestión vial cantonal.	86%	Se ejecutaron ¢53.665.831,84 logrando cubrir las necesidades de seguridad y soporte técnico necesario en el departamento.
5	Mantener al día los compromisos adquiridos mediante el prestamo con el IFAM n° 6-CVL-1457-07-18	100%	Se cumple al 100% con el pago de cuotas correspondientes del periodo.
6	Mantener el buen estado preferiblemte los caminos tipo A y B, dando prioridad a los de mayor IVTS y TPD, y los que dan acceso a zonas prioritarias para el desarrollo del cantón, sin dejar de atender los caminos C, que por decisión del Consejo de Distrito decida atenderlos, durante todo el año	96%	Se cumple 720,41 Km de mantenimiento. Por complicaciones de clima, códigos o intervención de terceros, no se pudo intervenir algunos caminos.
7	Mejorarar el estado de los caminos tipo A y B, dando prioridad a los de mayor IVTS y TPD, y los que dan acceso a zonas prioritarias para el desarrollo del cantón, durante todo el año	100%	Se cumple con 2523 ml en asfalto, realizando una buena optimización del recurso
8	Rehabilitar los sistema de drenajes de las vías tipo A, B y C del cantón. (Rehabilitación de 71 pasos de alcantarillas, en el periodo 2024)	92%	Se cumple 84 pasos. No se realizan algunos pasos necesarios ya que el presupuesto no fue el suficiente y otros por situación especial.



9	Rehabilitar los sistema de drenajes de las vías tipo A, B y C del cantón. (Rehabilitación del sistema de red pluvial, aceras y cunetas, mediante 7 proyectos, en el periodo 2024)	93%	Se cumple con 13 proyectos. No se realiza proyecto en camino 6-03-165 ya que el presupuesto no era suficiente.
10	Rehabilitar los sistema de drenajes de las vías tipo A, B y C del cantón. (Rehabilitación de 4 alcantarillas de cuadro, en el periodo 2024)	100%	Se cumple con la meta satisfactoriamente.
11	Rehabilitar en puentes relacionados con las actividades productivas del cantón o que conecten centros de población del cantón.	100%	Se cumple con la meta utilizando de manera óptima lo recursos.
12	Mejorar las condiciones de seguridad vial que brinda la infraestructura vial cantonal, especialmente en puntos de mayor accidentabilidad y riesgo.	100%	Se cumple con 5,75 Km en caminos con señalización, utilizando de manera óptima los recursos.
13	Atender casos de ejecución inmediata que se presenten durante el 2024 en el cantón.	100%	Se cumple con atender todas las emergencias aprobadas.
14	Atender los compromisos adquiridos mediante el convenio MOPT-BID- sobre las MMEC para el 2024	100%	Se logra contratar 60 km de Mantenimiento Manual, cumpliendo la meta satisfactoriamente.
15	Mejorar la red vial cantonal accesible durante todo el año	100%	Se cumple con los 2 proyectos de Asfalto con recursos del préstamo IFAM. Sin embargo, parte del presupuesto se depositará en el 2025.
16	Mejorar las condiciones de seguridad vial que brinda la infraestructura vial cantonal, especialmente en puntos de mayor accidentabilidad y riesgo.	90%	Se ejecutaron \$31.576.231,45 en demarcación en el casco urbano, utilizando de manera óptima lo recursos. Por lo que, no se cumple la meta de inversión de todos los recursos.

Junta Vial Cantonal

Muchas Gracias !!!

Municipalidad de Buenos Aires

